



DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL-FISE-16-02

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054975 - "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CANADA, FRACC. PALMERAS, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA CONTRATISTA MOVALDI GROUP, S.C.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO:

A BASE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO SDR-35, EXCAVACION, FORMACION DE PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CRIBA) HASTA 30 CMS SOBRE LOMO DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 24" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE ANILLOS OCTAGONALES DE CONCRETO, RELLENO A VOLTEO, MOTOCONFORMADO DEL TERRENO, COLOCACION DE REVESTIMIENTO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	11 DE JULIO DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$427,652.30
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 18/07/2016 AL 15/09/2016
4.-CONTRATISTA:	MOVALDI GROUP. S.C.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$128,295.69
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
3.- TIPOS DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO
4.- FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	02 DE SEPTIEMB. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$427,652.30



1.-NUMERO:	2
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION, REDUCCION Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	28 DE OCTUBRE DEL 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	02 DE SEPTIEMB. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$442,021.20

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 42,765.23	16 A 18618	11/07/2016
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 128,295.69	16 A 18611	11/07/2016
3.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO (ENDOSO)	\$ 44,202.12	16 A 18618	28/10/2016
4.- VICIOS OCULTOS	\$ 44,202.12	1780370-0000	31/10/2016

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR FIANZAS DORAMA, S.A.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	3 (TRES)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
ANTICIPO	12/07/2016	376		\$128,295.69	
1	15/11/2016	503	02/09/16 AL 26/09/16	\$192,728.54	\$82,597.95
2	15/11/2016	504	27/09/16 AL 21/10/16	\$ 75,039.63	\$32,159.84
3	15/11/2016	506	22/10/16 AL 31/10/16	\$45,957.33	\$13,537.90
TOTAL=				\$442,021.20	

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 442,021.20 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 442,021.20	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 442,021.20	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 128,295.69	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 128,295.69	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

477

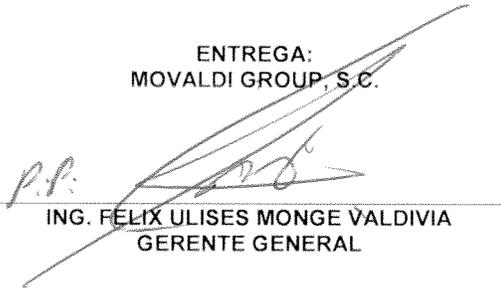


AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **D-SDS-BC-MXL-FISE-16-02**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**, RECIBE DE LA CONTRATISTA **MOVALDI GROUP, S.C.**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:


ENTREGA:
MOVALDI GROUP, S.C.


ING. FELIX ULISES MONGE VALDIVIA
GERENTE GENERAL

RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS


ING. ERNESTO GOMEZ MARIN
SUPERVISOR DE OBRA


ING. FRANCISCO A. VALLE SOTO
JEFE DE INVERSION PUBLICA

INVITADO
