



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ENERO-MARZO 2017

Liga Sharp-Centro de Convenciones

Cajon pluvial



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR 2014 2a ASIGNACIÓN	\$ 9'761,447	\$ 9'761,447	\$ 9'761,447	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					
Comentarios		Beneficiarios				
<p>Construcción de 143 ml de cajón pluvial de 4.00x2.5 mts. (Doble).</p>		<p>50,000 Personas.</p> <p>Al construirse el complemento de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la nueva vialidad para acceder al centro de convenciones por la carretera libre Tijuana Rosarito donde ya se realizan eventos a nivel: Regional, Nacional e Internacional.</p>				



14/51745



Liga Sharp-Centro de Convenciones



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR 2015 2ª ASIGNACION	\$ 58'987,310	\$ 58'987,310	\$ 33'075,342	57 %	56 %
Status de la obra	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiarios				
Construcción de 637 ml de cajones pluvial (Uno doble de 4.00x2.5 mts. y dos de 2.00x2.00 mts.) así como alumbrado público.		2,500 Personas Al construirse el complemento de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la nueva vialidad para acceder al centro de convenciones por la carretera libre Tijuana Rosarito donde ya se realizan eventos a nivel: Regional, Nacional e Internacional.				



Tramo Carretera Tijuana-Rosarito



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR 2015 3ª ASIGNACIÓN	\$ 18'660,158	\$ 18'660,158	\$ 18'660,158	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Se pavimentó un área de 11,023 m² con losa de concreto hidráulico, 8,973 m² de guarniciones, 13,488 m² de banquetas. 2,563 m² de cunetas, alumbrado público y señalamiento vial.</p>		<p>2,500 Personas</p> <p>Al modernizarse el tramo de vialidad en una longitud de 4 km en un carril por ambos sentidos con lo que se hará mas fluido el tráfico, ya que se evitará el congestionamiento vehicular, beneficiando a la ciudadanía en general.</p>				



15/53161



Centro de Control, Comando, Comunicación y cómputo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FASP 2016	\$ 799,970	\$ 799,970	\$ 799,970	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					
Comentarios		Beneficiados				
Construcción de muro perimetral, impermeabilización y pintura en muros interiores y exteriores.		4,000 Personas Al proteger el acceso a las instalaciones y mantener en buen estado la edificación, se beneficia a la ciudadanía en general.				




Calle Lázaro Cárdenas



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	PRODEUR	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALEC. FIN. INV. 2016	\$ 1'072,884	\$ 1'064,507	\$ 1'064,507	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Pavimentación de calles con 1,286 m² de losa de 15 cm incluida la re-nivelación de pozos de visita, tomas y descargas domiciliarias.</p>		<p>5,000 Personas</p> <p>Al pavimentarse 164 ml de calles entre Benito Juárez y 1o de Septiembre con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>				

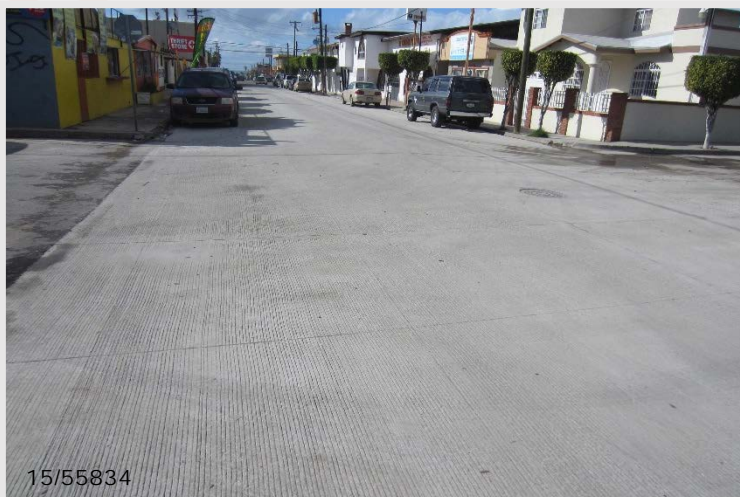

15/55834



Calle Mar Mediterráneo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	PRODEUR	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALEC. FIN. INV. 2016	\$ 4'004,133	\$ 4'004,133	\$ 2'362,438	60 %	59 %
Status de la obra	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
Retiro de adoquín existente y pavimentación de calles con 4,204 m ² de losa de 15 cm incluidas tomas y descargas domiciliarias, así como el señalamiento vial.		5,000 Personas Al pavimentarse 560 ml de calles entre Ébano y Encino con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.				



Rehabilitación de Vialidades

Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR 2016 1er ASIGNACION	\$ 10'193,718	\$ 10'193,718	\$ 3'251,381	35 %	32 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Bacheo, fresado re-encarpetado con asfalto en un área de 34,200 m², 350 m² de cunetas, 520 m² de vados, 580 ml de guarniciones y 120 ml de topes así como señalamiento vial.</p>	<p>1,100 Personas</p> <p>Al re-encarpetarse la totalidad del tramo en una longitud de 1,579 ml de vialidad con lo cual se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.</p>



Rehabilitación de Vialidades

Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR 2016 1er ASIGNACION	\$ 7'749,061	\$ 7'749,061	\$ 1'874,883	10 %	24 %
Status de la obra	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
Reconstrucción de vialidad en una longitud de 570 ml.		1,100 Personas Al reconstruirse el tramo en la longitud indicada de la vialidad, con lo cual se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.				



Pavimentacion Colonia Vista Hermosa



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR 2016 1er ASIGNACION	\$ 1'580,604	\$ 1'580,604	\$ 788,718	52 %	50 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 2,504 m² de losa, 490 ml de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas.</p>	<p>2,700 Personas</p> <p>Al pavimentarse el circuito que forman las calles paseo de las flores con concreto hidráulico con lo que se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>





Colonias Lucio Bco. y Ampl. L. Blanco

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALEC. FIN. INV. 2016	\$ 4'783,644	\$ 4'783,644	\$ 3'548,498	76 %	74 %
Status de la obra	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Pavimentación de calles con 7,313 m² de losa de 15 cm, 1,427 ml de guarniciones de concreto hidráulico incluida la re-nivelación de pozos de visita, tomas y descargas domiciliarias.</p>		<p>Personas</p> <p>Al pavimentarse 629 ml de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>				



15/55764



Bulevar Real de Rosarito 2ª Etapa



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1RA ASIG.					
Status de la obra	EN PROCESO	\$ 12'000,000	\$ 11'027,030	\$ 3'308,109	90 %	30 %

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de vialidad con 9,128 m² de losa de 20 cm y 2,907 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluido el señalamiento vial, Delegación Plan Libertador.</p>	<p>5,000 Personas</p> <p>Al construirse la nueva vialidad en una longitud de 594 ml, lo que hará mas fluido el tráfico, ya que se evitará el congestionamiento vehicular beneficiando principalmente la ciudadanía de la zona.</p>



16/56896

