



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

ÁLBUM SEMESTRAL

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

JULIO A DICIEMBRE DE 2025



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



MEXICALI

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA “ESTEFANÍA CASTAÑEDA”

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 27'384,649.60	\$ 18'183,738.20

OBRA

10010068364.- CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PLANTA ALTA PARA LA ESCUELA NORMAL “ESTEFANÍA CASTAÑEDA Y NÚÑEZ DE CÁCERES”, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
55 %	70 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONTADORES

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'462,099.98	\$ 2'261,977.72

OBRA

10010068567.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONTADORES, ENTRE CALLE RÍO DE LA PLATA Y CALLE RÍO AMAZONAS, COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
70 %	91 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4'493,895.70	\$ 4'493,895.70

OBRA

10010068520.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRACC. CERRADA DEL SOL I, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'835,088.00	\$ 3'385,088.00


OBRA

10010068521.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRACC. CERRADA DEL SOL II, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
96 %	100 %

MEXICALI

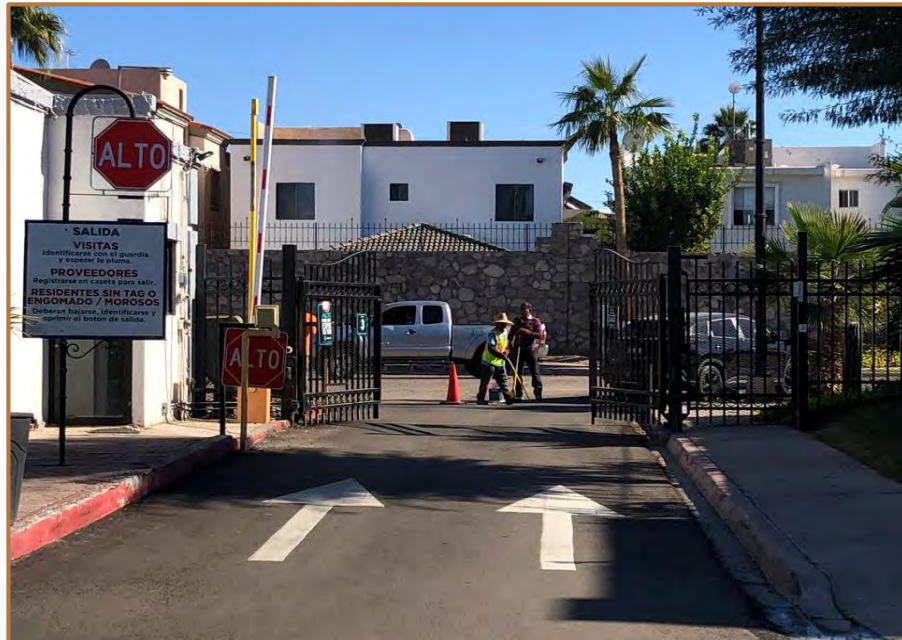

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y CUBIERTA PARA EL CAEM

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO BONO GÉNERO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'052,708.25	\$ 915,812.47

OBRA

10010068501.- CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y CUBIERTA DEL CENTRO DE APOYO EDUCATIVO PARA LA MUJER (CAEM), FRACC. SONORA, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	30 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 13'867,503.19	\$ 5'748,949.22

OBRA

10010068510.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE SISTEMAS INSTITUCIONALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	41 %

MEXICALI



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CJM

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO BONO GÉNERO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'492,743.79	\$ 1'831,893.77

OBRA

10010068498.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	73 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. QUETZALCÓATL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'106,270.76	\$ 1'106,270.76

OBRA

10010068318.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA E.P. QUETZALCÓATL, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CAM #6 / CAM #12

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'203,606.84	\$ 2'203,606.84

OBRA

10010067787.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE #6-CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE #12, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.P. MARIANO OTERO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'887,675.71	\$ 2'887,675.71

OBRA

10010067776.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. MARIANO OTERO-E.P. MALINCHE, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'602,895.17	\$ 1'602,895.17


OBRA

10010068472.- INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GENERAL PARA EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS "GONZÁLEZ ORTEGA", MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI

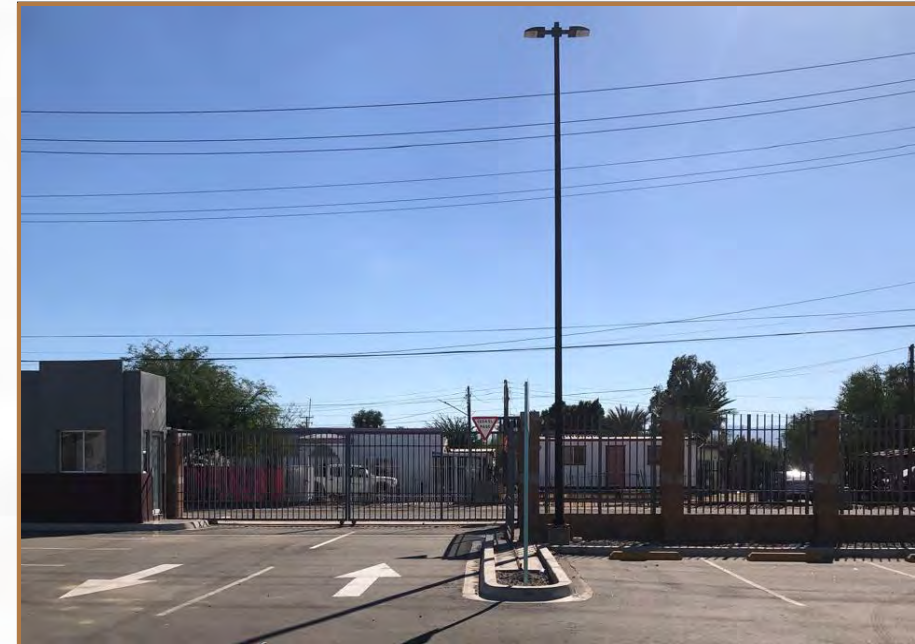

ACONDICIONAMIENTO DE SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8'484,266.04	\$ 6'074,342.04

OBRA

10010068473.- ACONDICIONAMIENTO DE SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS "GONZÁLEZ ORTEGA" (INTERIOR DE CASAS MÓVILES), EN MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	70 %

MEXICALI



PAVIMENTACIÓN EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA, 2.ª ETAPA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 11'280,121.39	\$ 11'280,121.39

OBRA

10010067777.- PAVIMENTACIÓN EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA, 2.ª ETAPA, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PASEO DEL CENTENARIO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'844,208.06	\$ 2'844,208.06

OBRA

10010068156.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PASEO DEL CENTENARIO, ENTRE CALLE MIRABUENO Y CALZADA DE LOS MONARCAS, FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, E.S.G # 50

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'998,953.72	\$ 1'998,953.72

OBRA

10010068321.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 50 "LIC. JOSÉ F. GUAJARDO", MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REMODELACIÓN DE EDIFICIO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 24'650,530.87	\$ 11'874,429.55

OBRA

10010068363.- REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	48 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER DE APOYO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'670,000.00	\$ 941,818.30

OBRA

10010068319.- CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR # LXXXVI, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	56 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, E.P. JOSÉ MARÍA IGLESIAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 271,324.00	\$ 255,578.67

OBRA

10010068246.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. JOSÉ MARÍA IGLESIAS, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	94 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN E.P. MANUEL DOBLADO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'143,455.54	\$ 1'043,863.95

OBRA

10010068253.- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. GENERAL MANUEL DOBLADO—E.P. SIMÓN BOLÍVAR, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	91 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'845,587.54	\$ 2'505,883.66

OBRA

10010068124.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE AVENIDA SANTIAGO XICOTENCATL Y AVENIDA MARIANO RIVA PALACIOS, COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	88 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 594,322.66	\$ 594,322.66

OBRA

10010068456.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SANTIAGO XICOTENCATL, ENTRE CALLE JOAQUÍN CARDOSO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA FLOR DE LIS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'625,000.00	\$ 1'467,706.70

OBRA

10010068548.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. FLOR DE LIS, ENTRE BLVD. EL ROBLEDO Y DREN, EN LA COL. CIPRES, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	40 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LOS PENSAMIENTOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4'902,125.15	\$ 3'217,872.79

OBRA

10010068547.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DE LOS PENSAMIENTOS, ENTRE CALLE OLIVO Y DREN, EN LA COL. CIPRES, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	65 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CONALEP # 154

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / MEDIA SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'148,605.89	\$ 1'148,605.89

OBRA

10010068309.- REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL CONALEP # 154, MEXICALI II, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TEATRO DEL ESTADO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10'989,592.42	\$ 6'464,319.68



OBRA

10010068416.- REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE DUCTOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TEATRO DEL ESTADO, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	60 %

MEXICALI

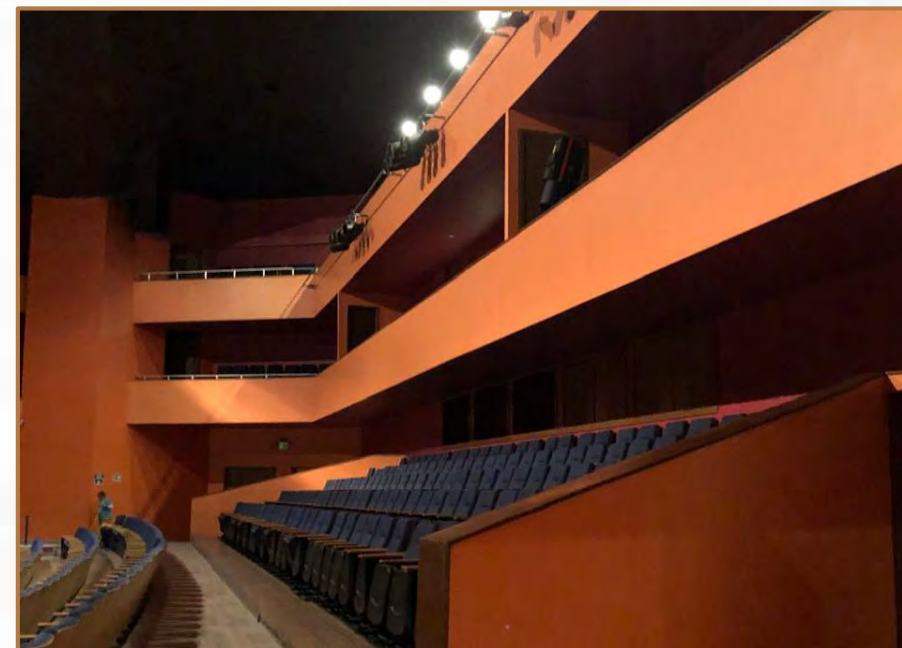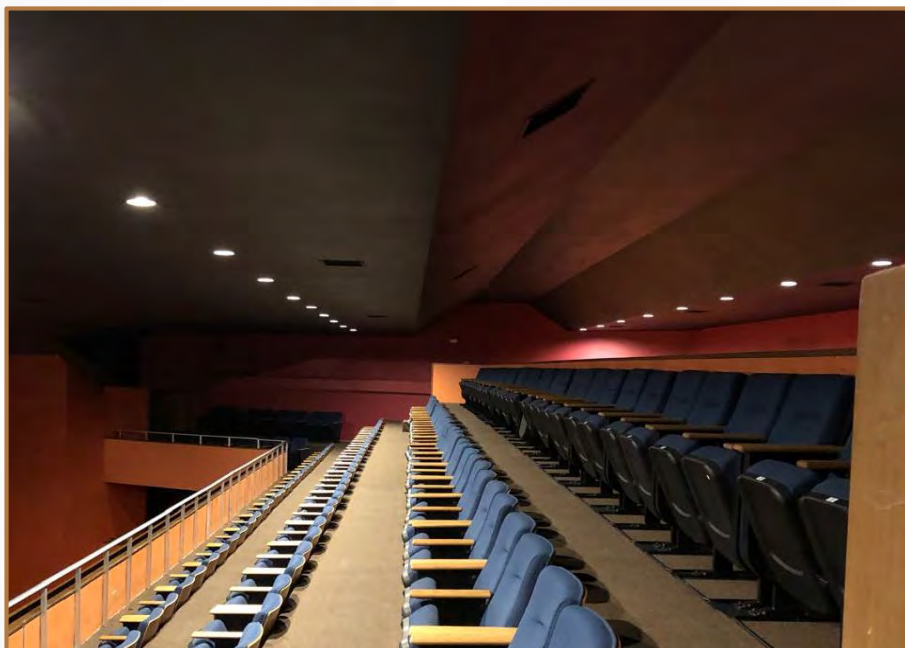



OBRA EXTERIOR EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'899,999.91	\$ 2'899,999.91


OBRA

10010068410.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI

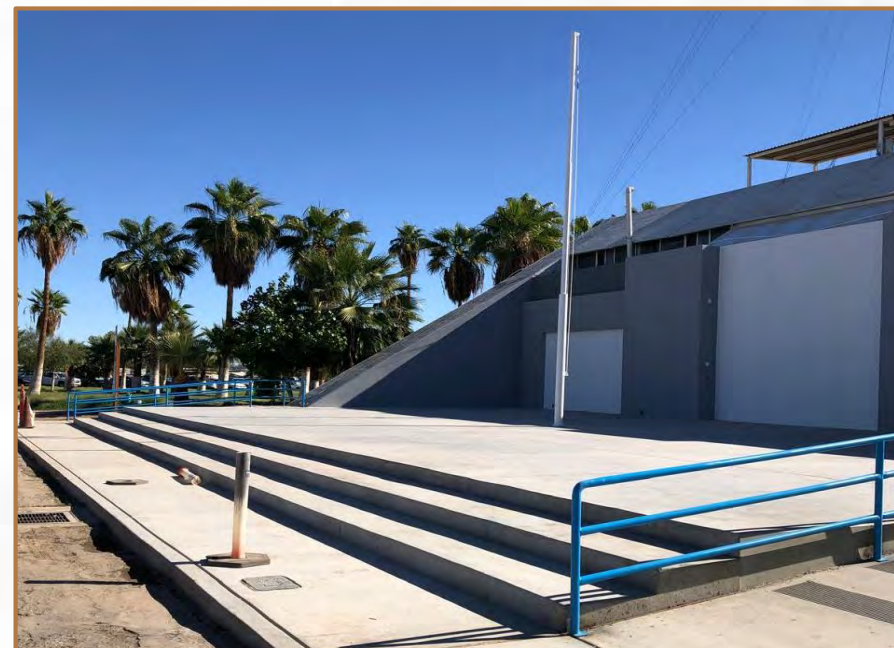



REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, E.P. 14 DE MARZO DE 1903

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'165,860.31	\$ 1'165,860.31

OBRA

10010068286.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. 14 DE MARZO DE 1903-E.P. VOLUNTAD, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'807,789.73	\$ 1'807,789.73

OBRA

10010068258.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE AV. DE LOS ROBLES EN KM 43

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'445,056.25	\$ 1'445,056.25

OBRA

10010068355.- REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE AV. DE LOS ROBLES, DE CALLE MEZQUITE A CALLE OCTAVA, EN KM. 43 DEL VALLE DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	100 %

MEXICALI





REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA # 104

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'498,665.55	\$ 1'524,528.85

OBRA

10010068327.- REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 104 "GREGORIO LARA GÜEREÑA", MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	60 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'955,184.89	\$ 2'955,184.89

OBRA

10010068125.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA VALLE NUEVO, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE TERCERA EN KM 43

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'963,283.65	\$ 2'963,283.65

OBRA

10010068356.- REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE TERCERA EN KM. 43, VALLE DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL VALLE DE MEXICALI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 75'817,984.20	\$ 45'858,692.80

OBRA

10010068112.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS POBLADOS DR. OVIEDO MOTA (REACOMODO), CARRANZA, GONZÁLEZ ORTEGA 3, MARÍTIMO, AMPLIACION MARÍTIMO Y FRACC. LAS PALMAS, EN EL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. PRIMER AÑO DE CONSTRUCCIÓN "OVIEDO MOTA NORTE", CÁRCAMO.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
30 %	60 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN EL VALLE DE MEXICALI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 93'111,751.26	\$ 90'262,710.50

OBRA

10010068113.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS POBLADOS DR. OVIEDO MOTA (REACOMODO), CARRANZA, GONZÁLEZ ORTEGA 3, MARÍTIMO, AMPLIACIÓN MARÍTIMO Y FRACC. LAS PALMAS, EN EL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. PRIMER AÑO DE CONSTRUCCIÓN "OVIEDO MOTA NORTE". RED SANITARIA

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	97 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO EN EL VALLE DE MEXICALI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 16'081,958.51	\$ 16'081,958.51

OBRA

10010068111.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS POBLADOS DR. OVIEDO MOTA (REACOMODO), CARRANZA, GONZÁLEZ ORTEGA 3, MARÍTIMO, AMPLIACIÓN MARÍTIMO Y FRACC. LAS PALMAS, EN EL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. PRIMER AÑO DE CONSTRUCCIÓN "OVIEDO MOTA NORTE". EMISOR

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. 24 DE FEBRERO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE B.C.
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'165,860.31	\$ 1'165,860.31

OBRA

10010068289.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. 24 DE FEBRERO, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN PARQUE LAGUNA MÉXICO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 344,900.54	\$ 344,900.54

OBRA

10010068481.- CONSTRUCCIÓN DE CERCO LADO PONIENTE DEL SEGUNDO CUADRANTE EN PARQUE LAGUNAR "LAGUNA MÉXICO", MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO FUERTE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'550,331.40	\$ 5'550,331.40

OBRA

10010068513.- REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO FUERTE (DE AV. MONTES DE OCA A CALZADA INDEPENDENCIA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'340,113.56	\$ 3'340,113.56

OBRA

10010068241.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. SOLEDAD PONCE DE LEÓN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'803,210.24	\$ 1'803,210.24

OBRA

10010068239.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. SOLEDAD PONCE DE LEÓN PATIÑO – E.P. JOEL DE LA PEÑA HERNÁNDEZ, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

MEXICALI





**BAJA
CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO



TIJUANA

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA ABELARDO L. RODRÍGUEZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 49,242,971	\$ 49,242,971


OBRA

10010066170.- REHABILITACIÓN 1.ª ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA

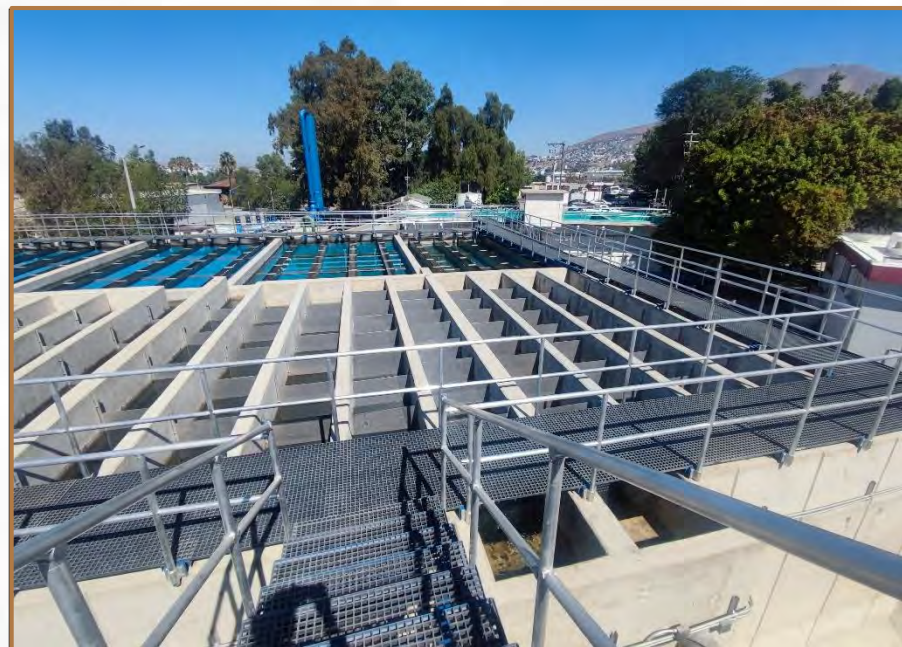

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESGUARDO FORENSE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,276,056	\$ 4,269,2828

OBRA

10010067657.- SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA ALBERGAR CUARTO FRIO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,072,211	\$ 3,072,211

OBRA

10010068080.- CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA ALBERGAR CUARTO FRÍO DENTRO DEL TERRENO DEL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA





CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA.
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 9,999,999	\$ 3,716,232

OBRA

10010068375.- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
19 %	37 %

TIJUANA





CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UTT

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA.
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 11,074,991	\$ 10,217,676


OBRA

10010068402.- 3.ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA, CUERPO 1, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	92 %

TIJUANA

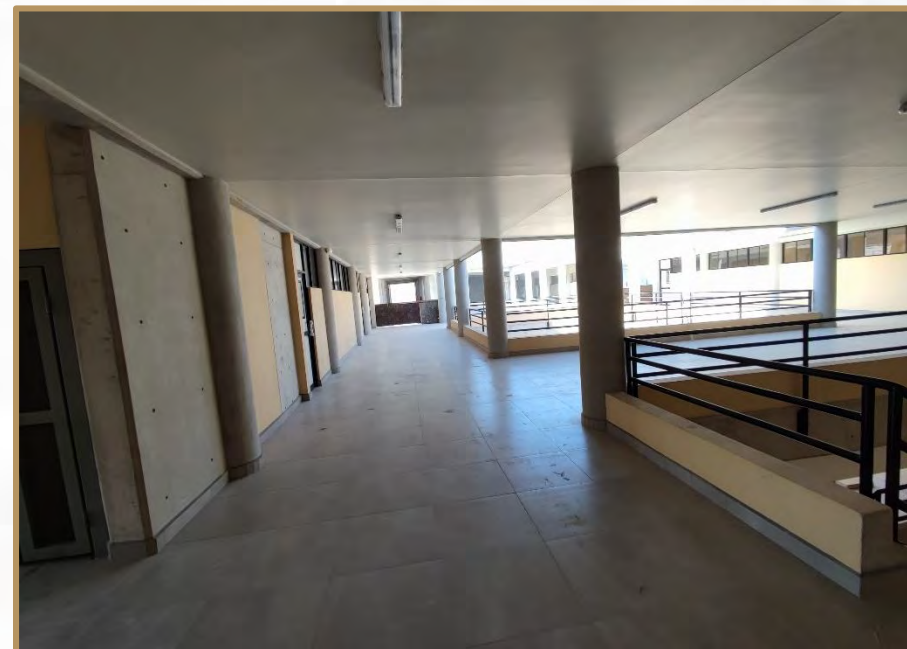

MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN PARQUE ESPERANTO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,797,765	\$ 4,797,765

OBRA

10010068049.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN PARQUE ESPERANTO, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



AUDITORIO PARA ESCUELA SECUNDARIA No. 214

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5,965,265	\$ 5,965,265

OBRA

10010067320.- SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 214, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRESA ALR-TANQUE MORELOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 34,583,718	\$ 32,057,730

OBRA

10010066358.- REHABILITACIÓN ACUEDUCTO PRESA ALR -TANQUE MORELOS, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	93 %

TIJUANA



REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO OBRERA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 28,849,790	\$ 28,849,790

OBRA

10010066385.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO OBRERA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO PARA ESCUELA No. 214

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,970,794	\$ 4,347,672


OBRA

10010068395.- TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 214, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	48 %

TIJUANA

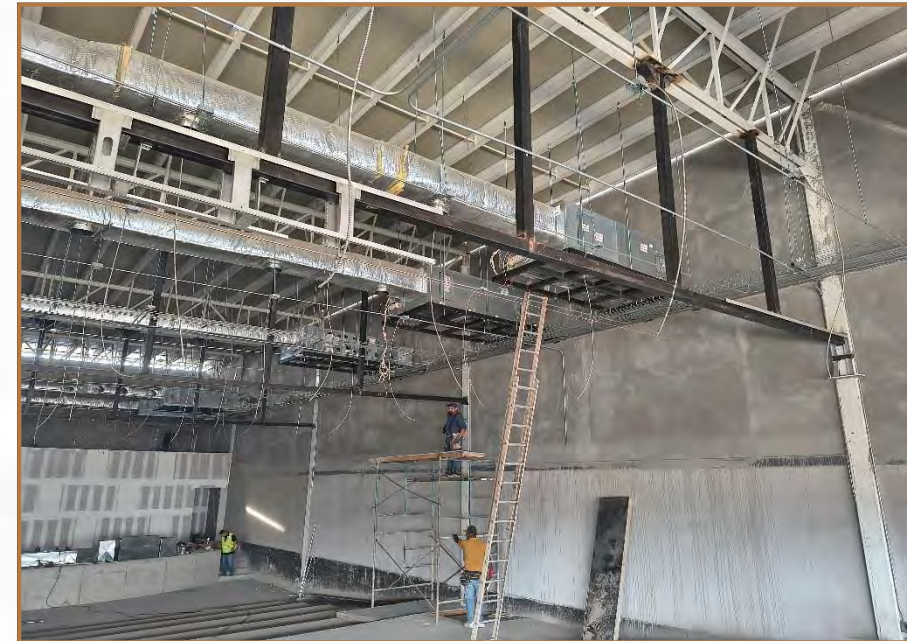

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA E.P. SIXTO ACEVEDO PÉREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,239,795	\$ 2,038,464

OBRA

10010068340.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ACCESO PARA LA E.P. SIXTO ACEVEDO PÉREZ - E.P. ANA MARÍA GABRIELA HERRERA VÁZQUEZ, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	63 %

TIJUANA





REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CAM GILBERTO RINCÓN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,500,000	\$ 1,500,000

OBRA

10010068342.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GILBERTO RINCÓN GALLARDO, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	100 %

TIJUANA





REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CAM PLAYAS DE TIJUANA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,499,998	\$ 1,499.998


OBRA

10010068343.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PLAYAS DE TIJUANA-CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	100 %

TIJUANA

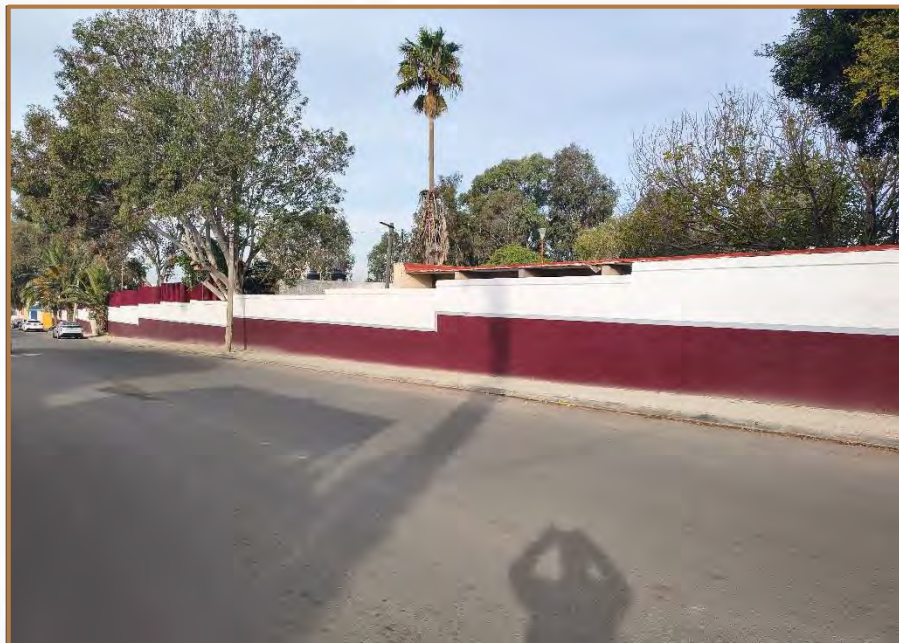

MURO DE CONTENCIÓN EN E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,998,582	\$ 1,899,195


OBRA

10010068440.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INFONAVIT PRESIDENTES, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	95 %

TIJUANA

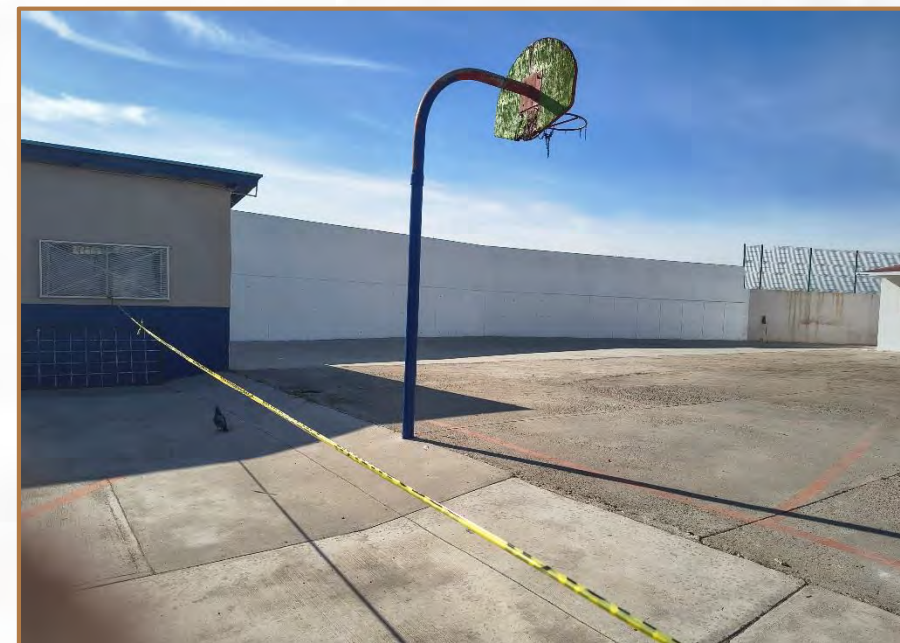

MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. ITA YUYU

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,484,000	\$ 2,349,602

OBRA

10010068449.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL J.N. ITA YUYU, COLONIA LOMA BONITA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	95 %

TIJUANA



LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE MURÚA A VÍA RÁPIDA ALAMAR

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 16,664,880	\$ 16,664,880

OBRA

10010067047.- REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE MURÚA-VÍA RÁPIDA ALAMAR, UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	100 %

TIJUANA



COLECTOR ORIENTE, TRAMO PUENTE NEGRO AL HOSPITAL GENERAL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 16,038,442	\$ 16,038,442

OBRA

10010068109.- REHABILITACIÓN DE COLECTOR ORIENTE, TRAMO PUENTE NEGRO AL HOSPITAL GENERAL, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ALTIPLANO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTRA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,196,806	\$ 2,345,975


OBRA

10010068466.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES JESÚS MARÍA Y SAULA ROSALES, EN LA COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
57 %	73 %

TIJUANA

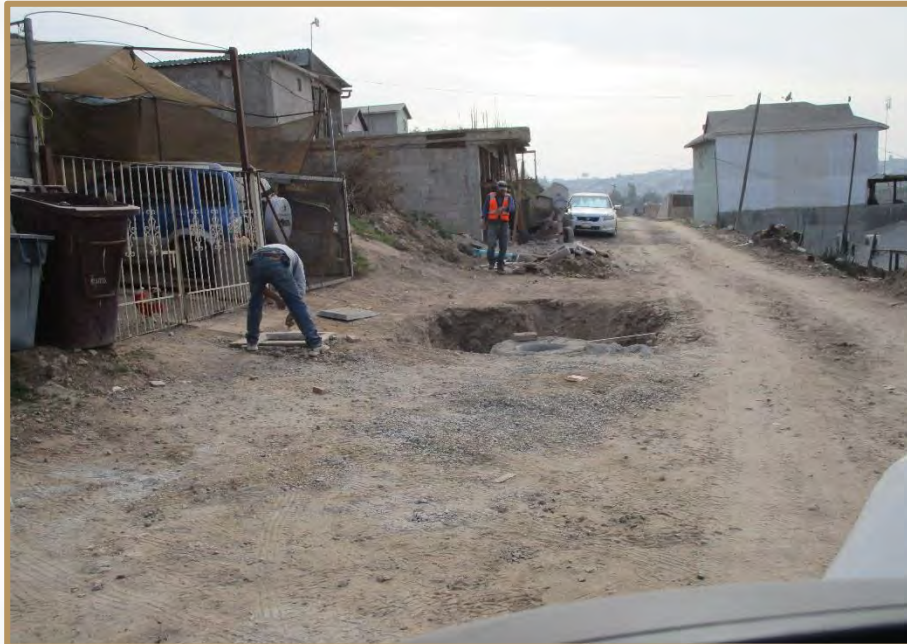

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ALTIPLANO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 2,538,338

EJERCIDO:

\$ 1,526,712

OBRA

10010068467.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE COMUNIDADES, CALLE NUEVA Y CALLE CIRCUITO 1, COLONIA ALTIPLANO, TERCERA SECCIÓN, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

56 %

FINANCIERO:

60 %

TIJUANA



PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PLANICIE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 15,075,444	\$ 15,075,444

OBRA

10010068515.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PLANICIE, 3.ª ETAPA , MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO EN PLAZA 11 DE JULIO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 6,482,351	\$ 5,824,847


OBRA

10010068554.- REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO EN PLAZA 11 DE JULIO, EN ZONA RIO, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	90 %

TIJUANA

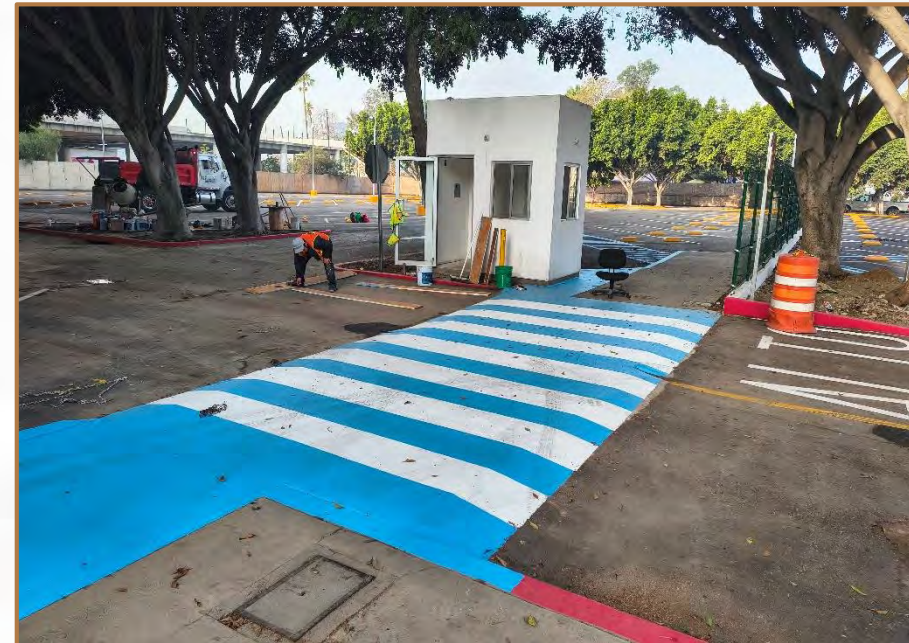



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 143,665,987	\$ 89,669,648

OBRA

10010068372.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDIFICIO 1 DE LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	62 %

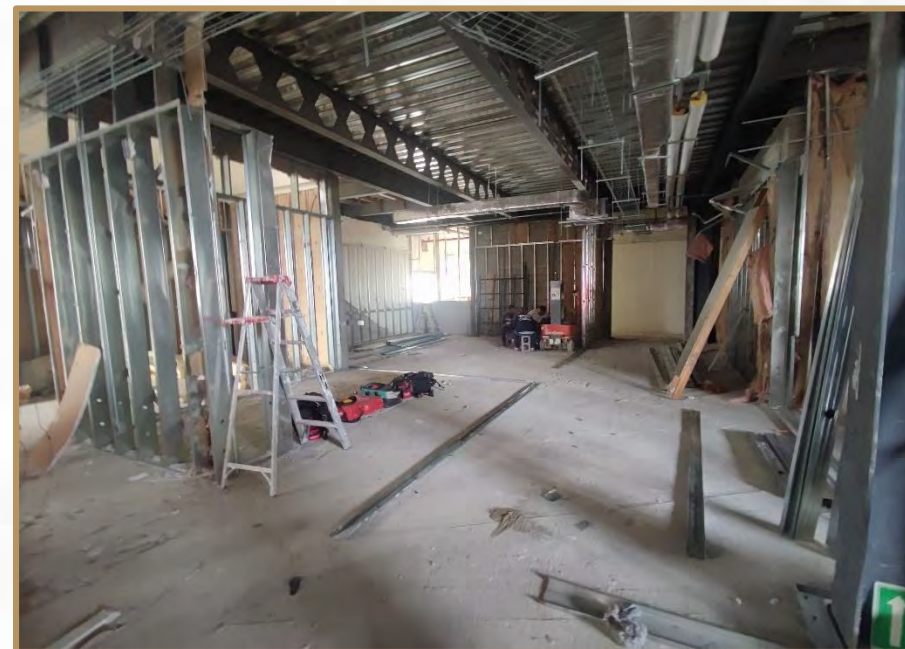



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 85,272,771	\$ 54,797,297

OBRA

10010068374.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDIFICIO 2, CUERPO "A", DE LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
89 %	64 %

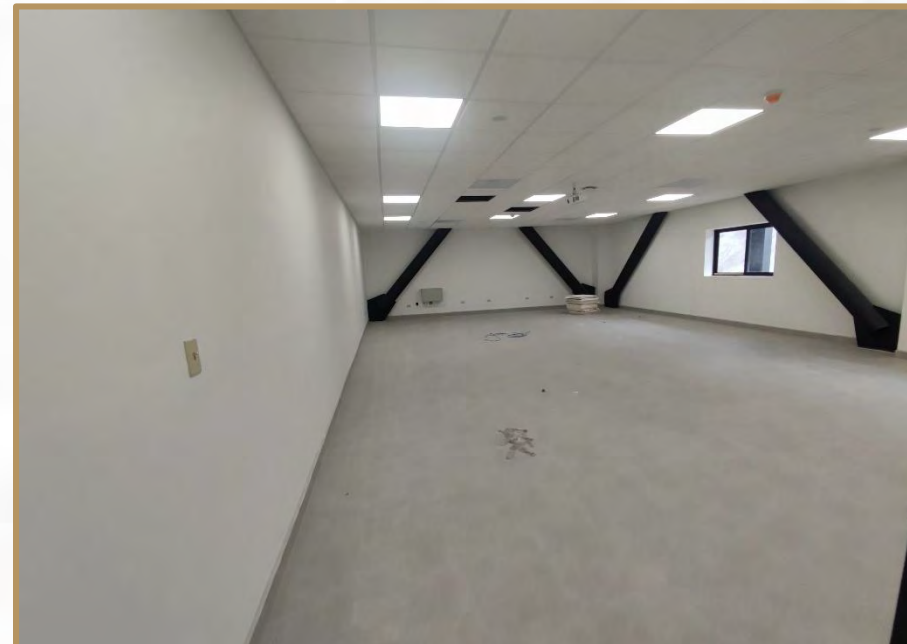



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 49,466,966	\$ 31,755,529


OBRA

10010068375.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDIFICIO 2, CUERPO "B", DE LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
87 %	64 %

TIJUANA

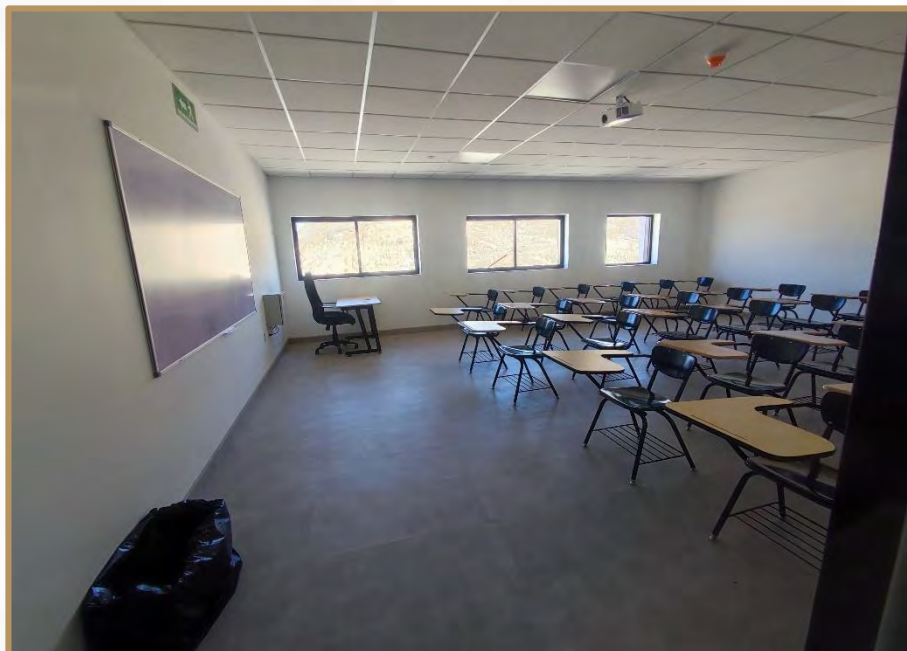



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10,499,998	\$ 9,937,466

OBRA

10010068377.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN TALUD PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	94 %



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 12,449,998	\$ 11,869,511

OBRA

10010068532.- SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN TALUD PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	94 %



TIJUANA



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 12,299,999	\$ 8,062,082

OBRA

10010068378.- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANAB.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
55 %	66 %





2.ª ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA, CUERPO 2, UTT

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10,875,290	\$ 6,465,394

OBRA

10010068403.- 2.ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA, CUERPO 2, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
70 %	59 %

TIJUANA



DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO BONO DE GENERO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,697,263	\$ 2,514,118

OBRA

10010068523.- AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
55 %	53 %

TIJUANA



EDIFICIO DE AULAS, FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA, UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 35,058,757	\$ 17,458,779

OBRA

10010068362.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA (GASTRONOMÍA) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, UNIDAD OTAY, CAMPUS TIJUANA, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
57 %	50 %

TIJUANA





PLATAFORMA DE JUEGO BURRO CEBRA EN PARQUE ESPERANTO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN



CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,899,067	\$ 3,899,067

OBRA

10010068512.- TRABAJOS DE TERRACERÍAS PARA PLATAFORMA DE JUEGO BURRO CEBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE ESPERANTO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

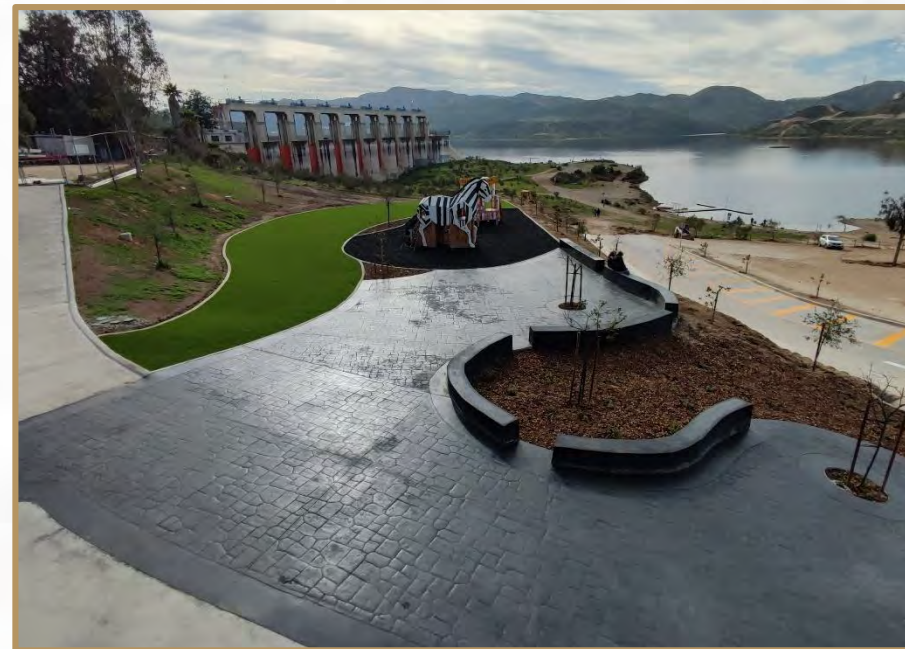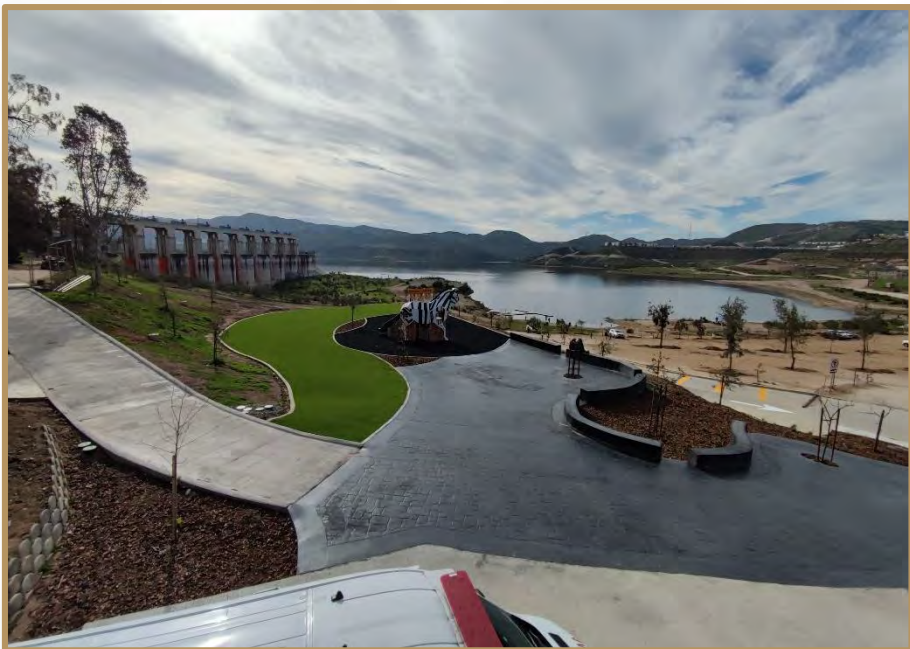

TIJUANA



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,998,389	\$ 6,712,527

OBRA

10010068339.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, MARGARITA RESIDENCIAL, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
66 %	84 %

TIJUANA





CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y MÓDULO SANITARIO, TELESECUNDARIA # 27

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 14,500,000	\$ 11,156,219

OBRA

10010068345.- CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA # 27 "BENITO JUÁREZ", TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
71 %	76 %



CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA # 37

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,088,635	\$ 6,948,926

OBRA

10010068338.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 37, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
72 %	86 %



CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA EL J.N. ANN LESLIE BROWN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,981,037	\$ 2,448,996

OBRA

10010068344.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. ANN LESLIE BROWN - J.N. VINCENT VAN GOGH, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
68 %	82 %

TIJUANA





CERCO PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS)

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,100,000	\$ 3,512,653

OBRA

10010068376.- CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS), TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
72 %	43 %

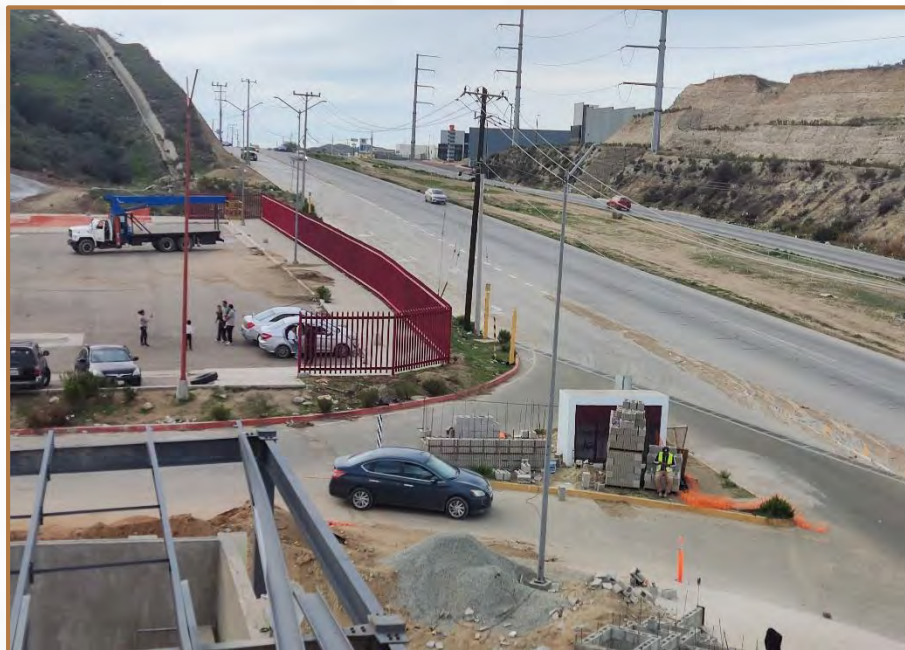



PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. UNIÓN ANTORCHISTAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,248,108	\$ 4,248,108

OBRA

10010068540.- PAVIMENTACIÓN C MARIEL HUERTA COL. UNION ANTORCHISTAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TIJUANA



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS II

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / MEDIA SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 9,340,108	\$ 4,455,110

OBRA

10010068537.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS II, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
24 %	48 %





REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN CAM MARIANO MATAMOROS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,196,950	\$ 1,621,825

OBRA

10010068341.- REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARIANO MATAMOROS, TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	50 %

TIJUANA





**BAJA
CALIFORNIA**

Gobierno del Estado



ENSENADA

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN No. 2

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,237,276	\$ 4,237,276

OBRA

10010066236.- REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN No. 2, DE HERIBERTO JARA Y SAN QUINTÍN HASTA BAHÍA DEL ROSARIO Y BAHÍA DE LOS REMEDIOS, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
92 %	100 %

ENSENADA



REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, COL. LOMITAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 14,838,900	\$ 14,838,900

OBRA

10010066243.- REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA COLONIA LOMITAS, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, COL. BENITO JUÁREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 12,422,104	\$ 12,422,104

OBRA

10010066245.- REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIA BENITO JUÁREZ, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100%

ENSENADA



REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, COL. EMPLEADOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,149,541	\$ 7,149,504

OBRA

10010066246.- REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIA EMPLEADOS, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE GAZA SURESTE EN NODO VIAL EL GALLO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 37,943,726.	\$ 37,943,726.

OBRA

10010067000.- CONSTRUCCIÓN DE GAZA SURESTE EN NODO VIAL EL GALLO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA





PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COL. POPULAR 89

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

PROGRAMA DE OBRA NORMAL

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 5,064,833.

EJERCIDO:

\$ 5,064,833.

OBRA

10010067783.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA POPULAR 89, ENSENADA, B. C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN E.P. IGNACIO ALTAMIRANO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,698,033.	\$ 1,601,598.

OBRA

10010068151.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN E.P. IGNACIO ALTAMIRANO, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	94 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN E.P. JOSÉ M^a. MORELOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,698,033.	\$ 1,698,033.

OBRA

10010068141.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA E.P. MAESTROS DE B.C.

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,552,222.	\$ 1,552,222.

OBRA

10010068144.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA LA E.P. MAESTROS DE BAJA CALIFORNIA, EN ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA J.N. 12 DE OCTUBRE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,499,402.	\$ 1,292,309.

OBRA

10010068152.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA EL J.N. 12 DE OCTUBRE – J.N. ANTONIO MELÉNDREZ, EN ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	86 %

ENSENADA





CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA J.N. JAIME SABINES.

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,182,470.	\$ 2,769,751.

OBRA

10010068219.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, BARDA PERÍMETRAL Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. JAIME SABINES, EN ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	63 %

ENSENADA





REHABILITACIÓN DE P.T.A.R. EL NARANJO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO VERDE TA

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 160,110,553.

EJERCIDO:

\$ 160,110,548.

OBRA

10010066206.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EL NARANJO, PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE P.T.A.R. EL SAUZAL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 42,861,802.	\$ 42,861,705.

OBRA

10010066257.- REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EL SAUZAL, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
98 %	99 %





REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO MORELOS ETAPA 2

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO VERDE TA

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 139,922,361.

EJERCIDO:

\$ 135,475,019.

OBRA

10010068266.- REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO MORELOS ETAPA 2, ESTACIÓN 21+827.92 AL 24+737.38 EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

65 %

FINANCIERO:

97 %

ENSENADA



REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO MORELOS, ETAPA 3

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 112,487,378.	\$ 110,365,187.

OBRA

10010068267.- REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO MORELOS, ETAPA 3, ESTACIÓN 17+989.08 AL 20+127.92, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
70%	98 %

ENSENADA



PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN COL. POPULAR 89

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,312,617.	\$ 7,312,617.

OBRA

10010068516.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA POPULAR 89, 2.ª ETAPA, ENSENADA, B. C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MAGAÑA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,116,497.	\$ 1,702,906.


OBRA

10010068126.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MAGAÑA, COLONIA MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA

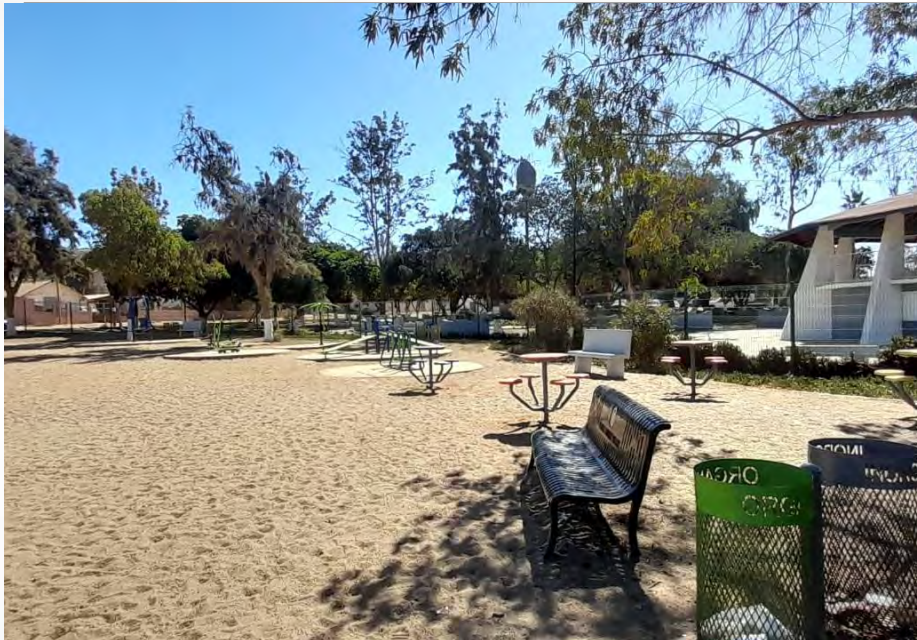

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LIC. BENITO JUÁREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,581,772.	\$ 2,581,772.

OBRA

10010068127.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LIC. BENITO JUÁREZ, COLONIA MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORTIVO JOSÉ REYES BONFINI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,155,446.	\$ 2,155,446.


OBRA

10010068129.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ JEREMÍAS REYES BONFINI, MANEADERO PARTE BAJA, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA

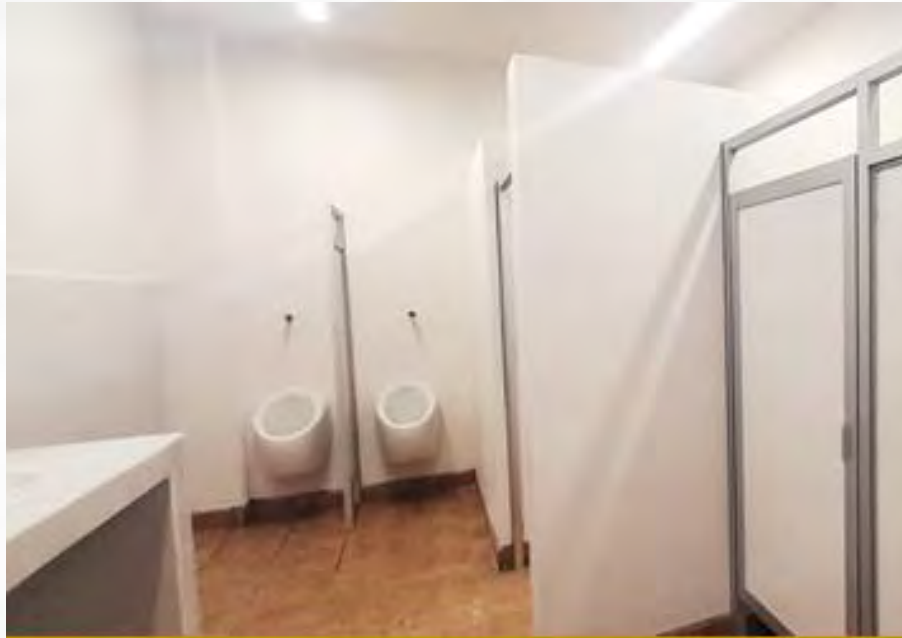

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO HUNDIDO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,653,208.	\$ 1,653,208..

OBRA

10010068133.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO HUNDIDO, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SAN ÁNGEL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,209,237.	\$ 2,209,237.

OBRA

10010068134.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SAN ÁNGEL, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO GOLFO DE SANTA CLARA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,783,869.	\$ 1,783,869.

OBRA

10010068135.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO GOLFO DE SANTA CLARA, COLONIA POPULAR 1989, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAS FLORES

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,541,739.	\$ 1,541,739.

OBRA

10010068272.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, UNIDAD DEPORTIVA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 648,027.	\$ 194,408.

OBRA

10010068586.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHÍA NORTE, COLONIA COLINAS DEL MAR, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
27 %	30 %

ENSENADA



REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 853,057.	\$ 286,097.


OBRA

10010068584.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHÍA NORTE, COLONIA COLINAS DEL MAR, ENSENADA, B.C./REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE COLINAS DEL SOL Y CALLE BAHÍA NORTE, COLONIA COLINAS DEL MAR, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
27 %	30 %

ENSENADA

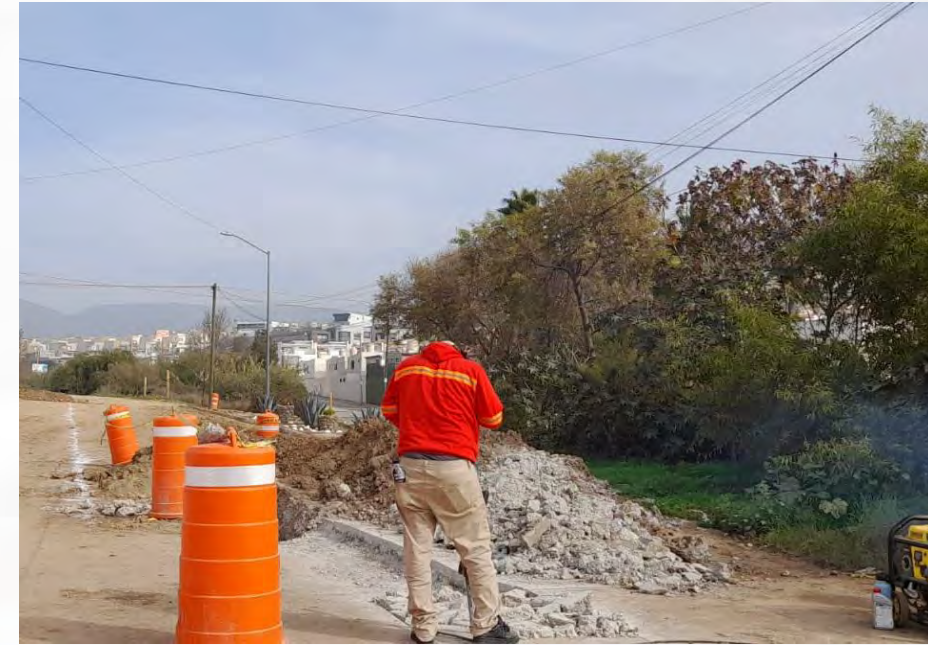

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN COBACH MANEADERO.

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 6,352,574.	\$ 6,352,574.

OBRA

10010068307.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, PARA EL COBACH PLANTEL EXTENSIÓN MANEADERO, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN MANEADERO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,667,064.	\$ 2,300,116.

OBRA

10010068694.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JESÚS GONZÁLEZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,047,600.	\$ 314,280.

OBRA

10010068699.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
24 %	30 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JOSEFA ORTIZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,353,634.	\$ 406,090.

OBRA

10010068704.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	30 %

ENSENADA





CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PEDRO MORENO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 1,477,629.

EJERCIDO:

\$ 443,288 .

OBRA

10010068708.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PEDRO MORENO EN COLONIA EL MANEADERO, RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

14 %

FINANCIERO:

30 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN E.P. MAESTROS DE B.C.

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,876,663.	\$ 1,876,663.

OBRA

10010068383.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. MAESTROS DE BAJA CALIFORNIA, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

ENSENADA



CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIO EN C.A.M. ESPECIAL # 09

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,500,000.	\$ 1,525,249.

OBRA

10010068438.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 9, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
55 %	61 %

ENSENADA





**BAJA
CALIFORNIA**

Gobierno del Estado



TECATE

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 22,662,103	\$ 22,617,284

OBRA

10010067046.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO CON CAPACIDAD DE 3,119 M3, EN COLONIA JUÁREZ, EN TECATE, B. C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA FUNDADORES

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,353,837	\$ 1,353,837

OBRA

10010068115.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA FUNDADORES, 2.ª ETAPA, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE





PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA BONDAD

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

PROGRAMA DE OBRA NORMAL

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 2,429,451

EJERCIDO:

\$ 2,429,451

OBRA

10010067780.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LA BONDAD, TECATE B. C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

100 %

TECATE





AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

RECURSO:

FINANCIAMIENTO VERDE TA

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 251,441,700.73

EJERCIDO:

\$ 188,189,586.97

OBRA

10010066176.- AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 L/S, EN TECATE, B. C.

AVANCE

FÍSICO:

81 %

FINANCIERO:

75 %



TECATE

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA No. 3

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,154,754	\$ 3,154,754

OBRA

10010068226.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EXTERIORES, REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA TELESECUNDARIA # 3 "LIBERTADORES", TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	100 %

TECATE



CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE DE LOS ENCINOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,494,173	\$ 1,494,173

OBRA

10010068379.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DE LOS ENCINOS, COL. COLINAS DEL CUCHUMA, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



EN PROCESO



CONCLUIDA

PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MILITAR

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,986,416	\$ 1,986,416

OBRA

10010068517.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MILITAR, MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,019,313	\$ 3,019,313

OBRA

10010068352.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3, "LÁZARO CÁRDENAS", TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN COBACH

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,739,000	\$ 2,547,350

OBRA

10010068406.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL COBACH PLANTEL TECATE, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
81 %	93 %

TECATE



CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA TELESECUNDARIA No. 36

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / EDUCACIÓN BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,294,157	\$ 1,294,157

OBRA

10010068283.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA # 36, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



REHABILITACIÓN EN ESPACIO DEPORTIVO, PARQUE LOS ENCINOS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 451,647	\$ 451,647

OBRA

10010068490.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO DEPORTIVO EN PARQUE LOS ENCINOS, EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C. (ÁREA DE BÉISBOL INFANTIL).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,420,929	\$ 1,420,929

OBRA

10010068518.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DESCANSO, MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA ESCORIAL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,549,538	\$ 3,549,538

OBRA

10010068519.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA ESCORIAL, MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

TECATE



TECHADO EN UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,613,403	\$ 812,563

OBRA

10010068742.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA, COLONIA CUAUHTÉMOC, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	31 %

TECATE





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



PLAYAS DE ROSARITO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

OBRAS EN E.P. EMILIANO ZAPATA-E.P. TIERRA Y LIBERTAD

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,155,929	\$ 2,029,285

OBRA

10010068210.- REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS EXTERIORES PARA LA E.P. EMILIANO ZAPATA - E.P. TIERRA Y LIBERTAD, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (PRIMO TAPIA)

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	94 %

PLAYAS DE ROSARITO



OBRAS EN J.N. ALEJANDRO FLEMING

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,797,442	\$ 2,106,623

OBRA

10010068224.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, OBRA EXTERIOR, FOSA SÉPTICA Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL J.N. ALEJANDRO FLEMING, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (PRIMO TAPIA)

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	75 %



REHABILITACIÓN DE PTAR ROSARITO NORTE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
RECURSO:	FINANCIAMIENTO VERDE TA
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 134,553,273	\$ 122,351,331

OBRA

10010066173.- REHABILITACIÓN DE PTAR ROSARITO NORTE, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	91 %

PLAYAS DE ROSARITO



PAVIMENTACIÓN EN COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 6,715,269	\$ 6,715,269

OBRA

10010068116.- PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %



CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO PARA JUZGADO MIXTO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,592,593	\$ 8,592,047

OBRA

10010067650.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO PARA JUZGADO MIXTO, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (3.ª ETAPA)

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

PLAYAS DE ROSARITO



CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. AZTLÁN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,496,907	\$ 1,233,426

OBRA

10010067774.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PARA LA E.P. AZTLÁN, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	82 %



OBRAS EN LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,447,388	\$ 727,580

OBRA

10010068248.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CANALIZACIÓN PLUVIAL Y BARDA POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
91 %	50 %



REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA TÉCNICA # 13

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,764,750	\$ 3,006,542

OBRA
10010068389.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 13 MICAELA AGUILERA TOPETE, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
73 %	80 %



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARA EL J.N. WA KUATAY

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,721,520	\$ 697,052

OBRA

10010068390.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARA EL J.N. WA KUATAY, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	40 %

PLAYAS DE ROSARITO



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. # 18

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,719,563	\$ 2,263,213

OBRA

10010068391.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, # 18, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
78 %	83 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA DEL PJBC



DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 83,869,531	\$ 76,912,280

OBRA

10010067795.- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA DEL PJBC EN ZONA COSTA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
94 %	92 %

PLAYAS DE ROSARITO

