



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

ÁLBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ABRIL A JUNIO DE 2020



SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 62

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 742,500.37	\$ 693,544 .39

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	93 %

OBRA
10010059604.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 62 “REVOLUCIÓN MEXICANA”, MEXICALI,B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 22

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 742,516.00	\$ 721,052.50

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	97 %

OBRA

10010059608.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 22 "LIC. BENITO JUÁREZ", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CARRETERA ESTATAL No. 11

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'199,340.51	\$ 3'066,606.21

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	96 %

OBRA

10010060441.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SOBRE CARRETERA ESTATAL No. 11, EJIDO ISLAS AGRARIAS B, KM 2 + 500, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali, B.C.

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FOTRADIS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'330,306.30	\$ 1'330,306.29

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

OBRA
10010060513.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar las condiciones de infraestructura en instalaciones de gobierno, con espacios para la accesibilidad de personas con capacidades diferentes.

MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 88

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 737,520.00	\$ 599,700.18

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	81 %

OBRA

10010059606.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 88 “LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO”, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN MIGUEL DE LA MADRID

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 735,779.57	\$ 599,878.52

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	82 %

OBRA

10010059609.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CAPITÁN MIGUEL DE LA MADRID", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 737,167.57	\$ 665,365.28

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
83 %	90 %

OBRA
10010059611.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA “RICARDO FLORES MAGÓN”, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



MEXICALI



REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 63

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'889,717.42	\$ 1'232,407.12

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	32 %

OBRA

10010060440.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 63, ENTRONQUE EJIDO GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali, B.C.





CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 715,289.56	\$ 214,586.87

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	30 %

OBRA

10010060584.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18 “MAGISTERIO”, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO PRADO DÍAZ

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 587,665.34	\$ 389,585.75

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	66 %

OBRA

10010060801.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "LEONARDO PRADO DÍAZ", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'248,518.89	\$ 374,555.67

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
45 %	30 %

OBRA

10010060823.- CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18 "MAGISTERIO", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

MEXICALI





CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PARAJES DE PUEBLA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'543,200.16	\$ 1'761,926.20

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
35 %	32 %

OBRA

10010060829.-CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN", PARAJES DE PUEBLA, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, PARAJES DE PUEBLA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'868,760.59	\$ 860,628.18

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
35 %	30 %

OBRA

10010060830.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO, CON DIRECCIÓN Y CERCO PERIMETRAL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PARAJES DE PUEBLA, "NUEVA CREACIÓN", MEXICALI , B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 1

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8'646,262.77	\$ 5'404,020.97

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	62 %

OBRA

10010061106.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 1, TRAMO EJIDO LEONA VICARIO A ESTACIÓN COAHUILA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.





SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

TIJUANA





CUBIERTA Y REPARACIÓN DE PLAZA CÍVICA, PARA LA ESCUELA PRIMARIA ANÁHUAC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 569,474.60	\$ 170,842.38

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	30 %

OBRA

10010061231.- CUBIERTA Y REPARACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'832,960.71	\$ 2'728,992.08

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	71 %

OBRA

10010061241.- PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO, 1ERA ETAPA (CALLE GONZALO GARCÍA Y CALLE LAURENTINO CRUZ), TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tijuana.





PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'869,878.92	\$ 2'767,303.93

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	72 %

OBRA

10010061245.-PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO TERCERA ETAPA (CALLE DEL ÁRBOL), TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tijuana.



TIJUANA



CONSTRUCCIÓN DE GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA, DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FAM SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 20'621,988.01	\$ 11'651,039.55

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	56 %

OBRA

10010059556.- CONSTRUCCIÓN DE GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ENERGÍAS RENOVABLES, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE LA UABC, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS, TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS

Al incrementar la infraestructura de la Universidad se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región, además de reducir el gasto en el consumo de energía eléctrica de la institución.





TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'482,474.85	\$ 2'076,862.11

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	60 %

OBRA

10010060587.- TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA.

COMENTARIOS

Al incrementar la infraestructura de la Universidad se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región.



PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4'266,425.28	\$ 2'537,381.30

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
83 %	59 %

OBRA

10010061244.- PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO SEGUNDA ETAPA (CALLE LAURENTINO CRUZ "PUENTE VEHICULAR"), TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tijuana.



TIJUANA



SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

ENSENADA





REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVENIDA SEXTA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4'601,958.91	\$ 4'455,918.04

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	97 %

OBRA

10010058099.- REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AV. SEXTA, ENTRE REFORMA Y AV. HIDALGO, ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Ensenada.



TERMINACIÓN DE RAMPA DE BOTADO EN EJIDO ERÉNDIDA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'668,257.60	\$ 1'860,570.53

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
52 %	70 %

OBRA

10010058420.- TERMINACIÓN DE RAMPA DE BOTADO EN EJIDO ERÉNDIDA.

COMENTARIOS

Con la realización de estas obras se incrementa la capacidad y seguridad del botado de lanchas y desembarque de productos marinos.





REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8'798,523.96	\$ 5'787,371.40

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	65 %

OBRA

10010060459.- REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO, DEL KM 15+000 AL KM 21+000, ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS

Obras de rehabilitación, para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Ensenada.

ENSENADA





CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AEROSPAECIAL, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFRA EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'574,977.95	\$ 4'475,438.03

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
88 %	80 %

OBRA

10010060742.- CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SECTOR AEROSPAECIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA.

COMENTARIOS

Al incrementar la infraestructura de la institución se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región, beneficiando a un mayor número de estudiantes.



CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEZ SEMYNOVICH VYGOTSKI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'856,380.85	\$ 556,914.26

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
21 %	30 %

OBRA

10010060805.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "LEZ SEMYNOVICH VYGOTSKI", ENSENADA, BC .

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.





CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS PRADO LUNA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'622,746.33	\$ 486,823.90

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	30 %

OBRA

10010060812.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS PRADO LUNA", ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



ENSENADA

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO MIGRANTE

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'120,000.00	\$ 336,000.00

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %

OBRA

10010060819.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO MIGRANTE", ENSENADA, B.C .

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

ENSENADA





SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAYAS DE ROSARITO





REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FOTRADIS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 161,284.08	\$ 145,620.32

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	90 %

OBRA

10010060496.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "ABELARDO L. RODRÍGUEZ" EN ZONA CENTRO, PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMENTARIOS

Obras para mejorar las instalaciones públicas con espacios para accesibilidad de personas con capacidades diferentes.



ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN COBACH PRIMER AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FOTRADIS
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 149,979.88	\$ 149,887.85

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

OBRA

10010060497.- ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN COBACH "PRIMER AYUNTAMIENTO", COL. AMPLIACIÓN REFORMA, EN PLAYAS DE ROSARITO.

COMENTARIOS

Obras para mejorar las instalaciones educativas con espacios para accesibilidad de personas con capacidades diferentes.





CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CULIACÁN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FISE
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 463,792.09	\$ 463,792.09

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

OBRA

10010060732.-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CULIACÁN, POLIDUCTO ENTRE GUERRERO Y MEXICALI, COL. AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, AGEB 0200500010275 EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMENTARIOS

Obras de alumbrado público, para modernización de la infraestructura básica que permita el acceso a colonias y zonas marginadas necesarias para lograr un desarrollo integral.





CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FISE
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 434,901.52	\$ 434,901.51

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

OBRA

10010060734.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LEOPOLDO ARROYO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, COL. AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR AGEBS 0200500880561 Y 0200500880928, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMENTARIOS

Obras de alumbrado público para modernización de la infraestructura básica que permita el acceso a colonias y zonas marginadas necesarias para lograr un desarrollo integral.





TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A PUERTO POPOTLA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'260,391.29	\$ 1'483,623.83

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
58 %	66 %

OBRA

10010059332.- TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A PUERTO POPOTLA, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Playas de Rosarito.





REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL EN BOULEVARD HISENSE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

RECURSO:

PRON CRÉDITO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 7'760,000.00

EJERCIDO:

\$ 3'211,874.23

AVANCE

FÍSICO:

48 %

FINANCIERO:


41 %

OBRA

10010061322.- REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL, BLVD. HISENSE Y BLVD. BENITO JUÁREZ EN PLAYAS DE ROSARITO.

COMENTARIOS

Obras de mantenimiento a la red pluvial para mejorar los servicios y brindar bienestar a los ciudadanos de Playas de Rosarito.

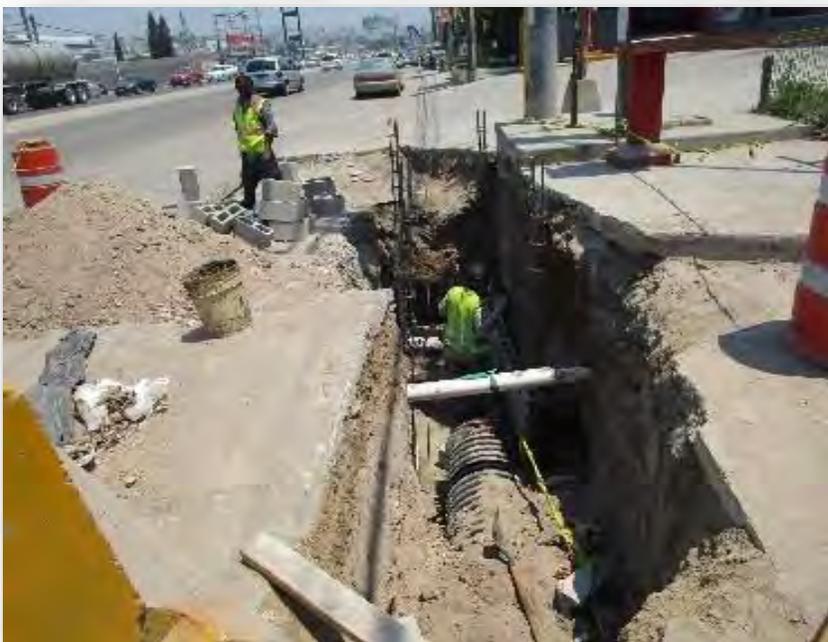



SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

TECATE





CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'578,047.55	\$ 1'426,381.63

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	90 %

OBRA

10010059462.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTATORIO", TECATE, B.C.

COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

TECATE





PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COLONIA LIBERTAD

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'328,992.15	\$ 3'128,440.96

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
70 %	59 %

OBRA

10010059665.- PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COLONIA LIBERTAD, TECATE, B.C.

COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tecate.

TECATE

