




**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# ÁLBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020



SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

MEXICALI



BAJA CALIFORNIA



**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 88**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 737,520.00	\$ 701,503.09

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	95 %

OBRA
10010059606.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 88, "LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



MEXICALI





## CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN

### DATOS GENERALES

<b>EJECUTOR:</b>	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>RECURSO:</b>	REMTE INFR EDUC
<b>ESTADO DE LA OBRA:</b>	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

<b>CONTRATADO:</b>	<b>EJERCIDO:</b>
\$ 737,167.56	\$ 725,288.12

### AVANCE

<b>FÍSICO:</b>	<b>FINANCIERO:</b>
100 %	98 %

### OBRA

10010059611.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA “RICARDO FLORES MAGÓN”, MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18

### DATOS GENERALES

<b>EJECUTOR:</b>	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>RECURSO:</b>	REMTE INFR EDUC
<b>ESTADO DE LA OBRA:</b>	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

<b>CONTRATADO:</b>	<b>EJERCIDO:</b>
\$ 715,289.56	\$ 664,503.40

### AVANCE

<b>FÍSICO:</b>	<b>FINANCIERO:</b>
100 %	93 %

### OBRA

10010060584.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18 “MAGISTERIO”, MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO PRADO DÍAZ

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 587,665.34	\$ 458,152.90

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	78 %

### OBRA

10010060801.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "LEONARDO PRADO DÍAZ", MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 1

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8'646,262.77	\$ 8'017,763.23

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	93 %

OBRA
10010061106.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 1, TRAMO EJIDO LEONA VICARIO A ESTACIÓN COAHUILA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.







## REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'511,388.24	\$ 2'785,683.41

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	79 %

OBRA
10010061424.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8, TRAMO No. 2, ENTRONQUE CARRETERA No. 87 HACIA POBLADO RANCHO GRANDE, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.







## REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO  
Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 2'605,223.53

**EJERCIDO:**

\$ 1'994,573.09

### AVANCE

**FÍSICO:**

100 %

**FINANCIERO:**

77 %

### OBRA

10010061425.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8, TRAMO No. 2, DEL POBLADO ÁLAMOS A LA LADRILLERA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.





## REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 3'624,657.46

**EJERCIDO:**

\$ 3'026,297.17

### AVANCE

**FÍSICO:**

100 %

**FINANCIERO:**

84 %

### OBRA

10010061426.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 8, TRAMO No. 3, DE LA LADRILLERA AL POBLADO LOS ALGODONES, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.







## REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 2

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'947,763.62	\$ 2'463,135.13

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	84 %

OBRA
10010061427.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 2, TRAMO DE LA PRESA AL POBLADO LOS ALGODONES, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali.







## CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN MIGUEL DE LA MADRID

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 735,779.57	\$ 715,332.17

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	97 %

OBRA
10010059609.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA ESCUELA PRIMARIA "CAPITÁN MIGUEL DE LA MADRID", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 107

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 735,576.71	\$ 336,892.55

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	46 %

### OBRA

10010059605.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 107, "CIENCIA Y DEPORTE", MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







**REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 63**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'889,717.42	\$ 1'232,407.12

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
82 %	32 %

OBRA
10010060440.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL No. 63, ENTRONQUE EJIDO GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del Municipio de Mexicali, B.C.



MEXICALI





## CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 6

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7'500,000.00	\$ 2'250,000.00

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
30 %	30 %

### OBRA

10010060797.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO “A”, “B” Y “C” (ÁREA ADMINISTRATIVA, 8 AULAS, MÓDULO SANITARIO, COMEDOR, PSICOMOTRICIDAD Y USOS MÚLTIPLES), PLAZA CÍVICA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 6, MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA 1ERO. DE DICIEMBRE DE 1953

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'209,395.40	\$ 472,788.56

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	39 %

### OBRA

10010060813.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y SEGUNDA ETAPA REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA "1ERO. DE DICIEMBRE DE 1953", MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 47

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 736,544.28	\$ 309,170.47

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	42 %

OBRA
10010060818.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 47 "CARLOS A. CARRILLO", MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







**CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA  
EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'248,518.89	\$ 697,613.71

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	56 %

OBRA
10010060823.- CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 18 “MAGISTERIO”, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



MEXICALI





## CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PARAJES DE PUEBLA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'543,200.16	\$ 2'232,846.16

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
45 %	40 %

OBRA
10010060829.- CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA (NUEVA CREACIÓN), PARAJES DE PUEBLA, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, PARAJES DE PUEBLA

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'868,760.59	\$ 1'215,587.24

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	42 %

### OBRA

10010060830.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO CON DIRECCIÓN Y CERCO PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PARAJES DE PUEBLA (NUEVA CREACIÓN), MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES NIVELES, EN CECYTE PLANTEL LOS PORTALES

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM MEDIA SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'243,136.94	\$ 972,941.08

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
20 %	30 %

### OBRA

10010060917.- CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO “B” DE TRES NIVELES Y OBRA EXTERIOR EN CECYTE PLANTEL LOS PORTALES, MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 813,316.00	\$ 243,994.79

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
70 %	30 %

OBRA
10010061410.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA, MEXICALI, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje







## ADAPTACIÓN DE CBTIS No. 21 PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FOTRADIS
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'248,872.27	\$ 374,661.68

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %

### OBRA


10010061524.- ADAPTACIÓN DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS) NO. 21, COL. SANTA MARÍA, PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEXICALI, B.C.

### COMENTARIOS

Obras para mejorar las instalaciones educativas con espacios para accesibilidad de personas con capacidades diferentes.







SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

TIJUANA



BAJA CALIFORNIA





## CONSTRUCCIÓN DE GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA, DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA UABC

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FAM SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 20'621,988.01	\$ 11'651,039.55

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	56 %

### OBRA

10010059556.- CONSTRUCCIÓN DE GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ENERGÍAS RENOVABLES, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE LA U.A.B.C., CAMPUS TIJUANA, UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS, TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Al incrementar la infraestructura de la Universidad se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región, además de reducir el gasto en el consumo de energía eléctrica de la institución.







**PAVIMENTACIÓN DE COLONIA BUENOS AIRES NORTE**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'568,345.72	\$ 990,874.75

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	63 %

OBRA
10010060433.- PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA BUENOS AIRES NORTE, TIJUANA, B. C.

COMENTARIOS
Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tijuana.



TIJUANA





## PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	JUNTA DE URBANIZACIÓN
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4'266,425.28	\$ 4'144,652.61

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	97 %

### OBRA

10010061244.- PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO SEGUNDA ETAPA (CALLE LAURENTINO CRUZ "PUENTE VEHICULAR"), TIJUANA, B. C.

### COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tijuana.







## CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SIXTO ACEVEDO PÉREZ

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FISE
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 824,500.00	\$ 683,210.32

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	83 %

OBRA
10010061268.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "SIXTO ACEVEDO PÉREZ", COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'482,474.85	\$ 3'054,130.50

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
88 %	88 %

OBRA
10010060587.- TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, (57905), TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS
Al incrementar la infraestructura de la Universidad se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región.







## CONSTRUCCIÓN DE BIOTERIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UABC

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	REMTE INFR EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'500,000.00	\$ 1'461,991.78

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	42 %

### OBRA

10010060590.- CONSTRUCCIÓN DE BIOTERIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Al incrementar la infraestructura de la Universidad se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región.







## CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA GILBERTO BOSQUES SALDIVAR

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'928,460.25	\$ 4'402,809.38

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	74 %

### OBRA

10010060844.- CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, PÓRTICO Y ESCALERA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GILBERTO BOSQUES SALDIVAR", TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje







## CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'583,410.09	\$ 1'076,761.06

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
12 %	42 %

OBRA
10010060883.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y ESCALERA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30, TIJUANA, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje







## SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO

### DATOS GENERALES

<b>EJECUTOR:</b>	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>RECURSO:</b>	FAM BÁSICO
<b>ESTADO DE LA OBRA:</b>	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

<b>CONTRATADO:</b>	<b>EJERCIDO:</b>
\$ 774,452.53	\$ 590,525.36

### AVANCE

<b>FÍSICO:</b>	<b>FINANCIERO:</b>
80 %	76 %

### OBRA

10010060960.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN UN MÓDULO DE 4 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO", TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 114

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
RECURSO:	FISE
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

#### CONTRATADO:

\$ 436,500.00

#### EJERCIDO:

\$ 305,111.75

### AVANCE

#### FÍSICO:

98 %

#### FINANCIERO:

70 %

### OBRA

10010061267.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GRADAS METÁLICAS CON MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA No. 114, COLONIA ALTIPLANO, TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE AULA, CUBIERTA Y BARDA PARA JARDÍN DE NIÑOS 8 DE MARZO

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'446,229.07	\$ 850,052.91

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	59 %

### OBRA

10010061324.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, CUBIERTA METÁLICA Y BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "8 DE MARZO", TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA PARA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS DE B.C.

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 800,000.00	\$ 671,589.25

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	84 %

### OBRA

10010061330.- REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DE CUBIERTA DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN PARA LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS DE BAJA CALIFORNIA", TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES PARA ESCUELA PRIMARIA PATRONATO PRO-EDUCACIÓN

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'016,338.15	\$ 386,531.97

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
11 %	38 %

OBRA
10010061333.- CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA "PATRONATO PRO-EDUCACIÓN", TIJUANA. B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para mejorar la infraestructura física en instalaciones escolares para ofrecer condiciones apropiadas que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO  
Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 6'547,878.40

**EJERCIDO:**

\$ 3'738,808.95

### AVANCE

**FÍSICO:**

95 %

**FINANCIERO:**

57 %

### OBRA


10010061501.- ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE EN TIJUANA, B.C.

### COMENTARIOS

Al llevar a cabo obras de adecuación al edificio del Instituto de Movilidad Sustentable en Tijuana, B.C., se dará un mejor servicio a la población.







SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

ENSENADA



BAJA CALIFORNIA





## REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVENIDA SEXTA

### DATOS GENERALES

<b>EJECUTOR:</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
<b>RECURSO:</b>	PRON CRÉDITO
<b>ESTADO DE LA OBRA:</b>	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

<b>CONTRATADO:</b>	<b>EJERCIDO:</b>
\$ 4'601,958.91	\$ 4'511,921.91

### AVANCE

<b>FÍSICO:</b>	<b>FINANCIERO:</b>
100%	98%

### OBRA

10010058099.- REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AV. SEXTA, ENTRE REFORMA Y AV. HIDALGO, ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Ensenada.



ENSENADA





## TERMINACIÓN DE RAMPA DE BOTADO EN EJIDO ERÉNDIRA

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 2'688, 257.60

**EJERCIDO:**

\$ 2'146,943.49

### AVANCE

**FÍSICO:**

100 %

**FINANCIERO:**

80 %

### OBRA

10010058420.- TERMINACIÓN DE RAMPA DE BOTADO EN EL EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Con la realización de estas obras se incrementa la capacidad y seguridad del botado de lanchas y desembarque de productos marinos.



ENSENADA





## REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO  
URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 8'798,523.96

**EJERCIDO:**

\$ 8'721,094.17

### AVANCE

**FÍSICO:**

100 %

**FINANCIERO:**

99 %

### OBRA

10010060459.- REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CARRETERA CHAPULTEPEC-MANEADERO, DEL KM. 15+000 AL KM. 21+000, ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de rehabilitación para mejorar y hacer más eficiente la red de carreteras del municipio de Ensenada.



ENSENADA





## SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CALLE SEXTA

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2'436,974.79	\$ 2'436,974.79

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100%	100%

### OBRA

10010061311.- SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CALLE SEXTA, TRAMO AVENIDA GUADALUPE A CALLE ESPINOZA, ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Ensenada.



ENSENADA





## CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AEROSPAECIAL, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMTE INFRA EDUC
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5'574,977.95	\$ 5'537,119.10

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	99 %

OBRA
10010060742.- CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SECTOR AEROSPAECIAL, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA, ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS
Al incrementar la infraestructura de la institución se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región, beneficiando a un mayor número de estudiantes.



ENSENADA





## TERMINACIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EJIDO ERÉNDIRA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	PRON CRÉDITO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3'789,823.89	\$ 1'136,947.17

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	30 %

OBRA
10010059350.- TERMINACIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUERTO SAN ISIDRO, EJIDO ERÉNDIRA , ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS
Con la realización de estas obras se incrementa la capacidad y seguridad del botado de lanchas y desembarque de productos marinos.



ENSENADA





## CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS LEV SEMYNOVICH VYGOTSKI

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'856,380.85	\$ 1'099,990.11

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	59 %

### OBRA

10010060805.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "LEV SEMYNOVICH VYGOTSKI", ENSENADA, B.C..

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS PRADO LUNA

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'622,746.33	\$ 1'079,747.97

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	66 %

### OBRA

10010060812.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS PRADO LUNA", ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA NIÑO MIGRANTE

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'120,000.00	\$ 468,095.05

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
20 %	42 %

### OBRA

10010060819.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO MIGRANTE", ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



ENSENADA





**CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'596,142.72	\$ 958,646.28

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	41 %

OBRA
10010060824.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS", ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



ENSENADA





**CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA CIUDADES HERMANAS**

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1'609,569.94	\$ 1,052,444.92

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	65 %

OBRA
10010060834.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CIUDADES HERMANAS", ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS
Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.

ENSENADA







## REHABILITACIÓN DE ACCESO A COLONIA OAXACA

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 4'678,910.16

**EJERCIDO:**

\$ 2'119,979.42

### AVANCE

**FÍSICO:**

30 %

**FINANCIERO:**

45%

### OBRA

10010061385.- REHABILITACIÓN DE ACCESO A COLONIA OAXACA, ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de construcción de nuevas vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Ensenada.



ENSENADA





## CONCLUSIÓN DEL CENTRO AEROESPACIAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM SUPERIOR
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 19'091,600.41	\$ 5'727,480.13

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	30 %

OBRA
10010061392.- CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADO PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA, ENSENADA, B.C.

COMENTARIOS
Al incrementar la infraestructura de la institución se permite a ésta ampliar la cobertura de atención en las carreras de mayor demanda en la región, beneficiando a un mayor número de estudiantes.







## RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, COLONIA EL PARAÍSO

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO  
URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 1'703,932.77

**EJERCIDO:**

\$ 511,179.83

### AVANCE

**FÍSICO:**

12 %

**FINANCIERO:**

30%

### OBRA


10010061429.- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CONSTRUCCIÓN DE PARQUE; ÁREA VERDE, ANDADORES Y JUEGOS INFANTILES) EN LA COLONIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de recuperación de predio para la construcción de un espacio, que permita a los residentes de la colonia contar con infraestructura para su sano esparcimiento.







**SH**

SECRETARÍA DE HACIENDA

# PLAYAS DE ROSARITO



BAJA CALIFORNIA





## CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN TELESECUNDARIA No. 119

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 298,834.64	\$ 298,834.64

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

OBRA
10010060802.- CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA PARA LA TELESECUNDARIA No. 119, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMENTARIOS
Construcción de obras de protección a instalaciones que proporcionan educación con métodos de tecnología de vanguardia a la juventud.







## CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS REAL DE ROSARITO

### DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FAM BÁSICO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 582,481.48	\$ 582,481.48

### AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %

### OBRA

10010060864.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RODAPIE EN CERCO PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS (NUEVA CREACION) "REAL DE ROSARITO", EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

### COMENTARIOS

Realización de obras para incrementar y mejorar la infraestructura física con nuevas instalaciones escolares para ofrecer mayores oportunidades que permitan fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.







## REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL BOULEVARD HISENSE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ

### DATOS GENERALES

<b>EJECUTOR:</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
<b>RECURSO:</b>	PRON CRÉDITO
<b>ESTADO DE LA OBRA:</b>	CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

<b>CONTRATADO:</b>	<b>EJERCIDO:</b>
\$ 7'760,000.00	\$ 4'887,928.17

### AVANCE



<b>FÍSICO:</b>	<b>FINANCIERO:</b>
100 %	63 %

### OBRA

10010061322.- REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL, BOULEVARD HISENSE Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

### COMENTARIOS

Obras de mantenimiento a la red pluvial para mejorar los servicios y brindar bienestar a los ciudadanos de Playas de Rosarito.

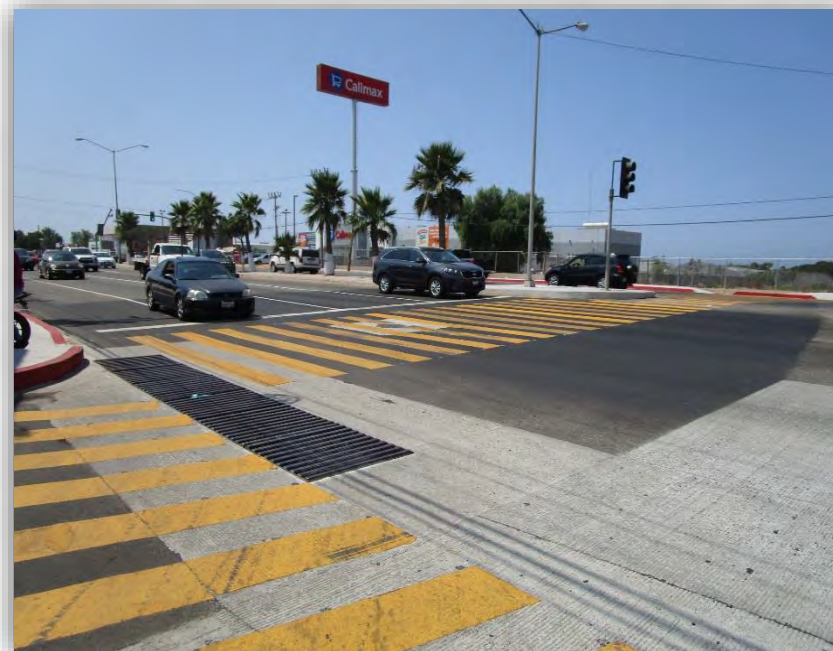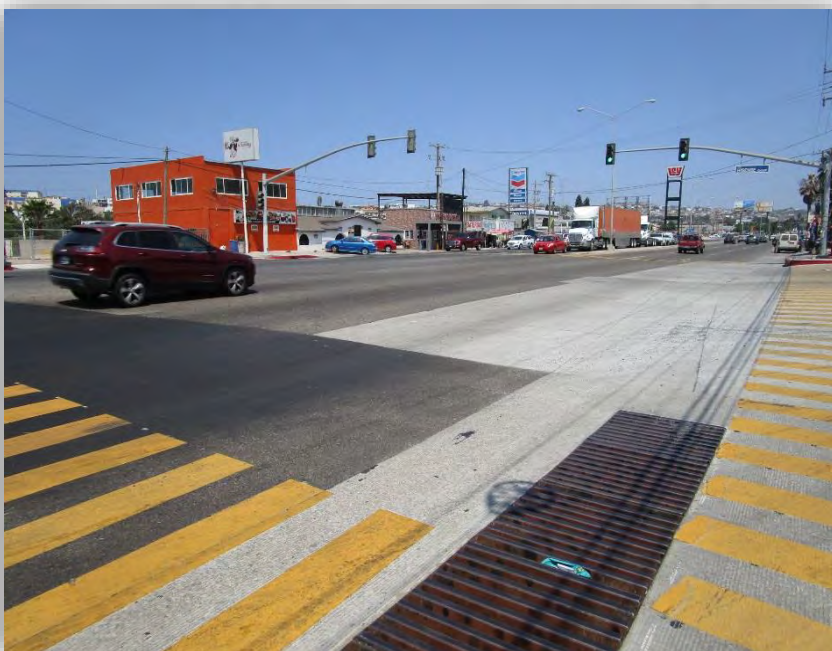





## TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A PUERTO POPOTLA

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

EN PROCESO

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 2'260,391.29

**EJERCIDO:**

\$ 1'636,038.40

### AVANCE

**FÍSICO:**

80 %

**FINANCIERO:**

72 %

### OBRA


10010059332.- TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A PUERTO POPOTLA, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

### COMENTARIOS

Obras de mejoramiento de vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Playas de Rosarito.







SH

SECRETARÍA DE HACIENDA

TECATE



BAJA CALIFORNIA





## PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COLONIA LIBERTAD

### DATOS GENERALES

**EJECUTOR:**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO  
URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

**RECURSO:**

PRON CRÉDITO

**ESTADO DE LA OBRA:**

CONCLUIDA

### FLUJO DE INVERSIÓN

**CONTRATADO:**

\$ 5'328,992.15

**EJERCIDO:**

\$ 4'274,030.68

### AVANCE

**FÍSICO:**

100 %

**FINANCIERO:**

80 %

### OBRA

10010059665.- PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COLONIA LIBERTAD, TECATE, B.C

### COMENTARIOS

Obras de construcción de nuevas vialidades primarias y secundarias que permitan el tránsito ágil y seguro de los habitantes de Tecate.

