GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

ACTA DE SITIO

No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01

LOS SUSCRITOS CC. ING. CUTBERTO ZARATE CARRETERO E ING. EDUARDO SALAS ALVARADO, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN ENSENADA Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚM. 004053734200 Y 0083044793221 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE PRESENTARON A LAS **11:00** HORAS EL DÍA **27 DE AGOSTO DE 2019**, EN EL SITIO DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LAS OBRAS ***10010058527.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO, ENTRE LA CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA B.C., 10010058529.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE, 10010058531.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA PALMILLA, ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHÍA CAMALÚ, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE, 10010059144.- MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE, 10010059145.- INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA, B.C., 10010059621.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EJECUTADAS CON CARGO AL PROGRAMA "***FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)***" DEL **EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018**, CONVENIDOS CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE) CON EL FIN DE CORROBORAR MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA QUE LAS OBRAS ANTES DESCRITAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, ASÍ COMO EL ESTADO ACTUAL DE LAS MISMAS. ---------
---

REALIZANDO LA PRESENTE DILIGENCIA CON EL C. ING. JORGE ABRAHAM GUARDADO RAMIREZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE) DELEGACIÓN ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚM. 1593539450, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. ----------

EN BASE AL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y

ACTA DE SITIO

No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01

COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", SUSCRITO ENTRE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 2009 Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SU ARTÍCULO 25; REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN SUS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN VI, 11, 36 FRACCIÓN XXIII Y 38 FRACCIÓN VI; Y LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SU ARTÍCULO 81. ----------
DE LA DILIGENCIA PRACTICADA SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: ----------

SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EN COORDINACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE) A FIN DE CORROBORAR QUE ESTAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, ASÍ COMO EL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA ENCONTRÁNDOSE LO SIGUIENTE: ----

RESPECTO A LA OBRA ***10010058527.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO, ENTRE LA CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA B.C.,*** CON NÚMERO DE CONTRATO **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02** CELEBRADO CON FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 1)**. ----------

RESPECTO A LA OBRA ***10010058529.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** CON NÚMERO DE CONTRATO **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03** CELEBRADO CON FECHA DE 25 DE JUNIO DEL 2018, EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 2)**. ----------

RESPECTO A LA OBRA ***10010058531.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA PALMILLA, ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHÍA CAMALÚ, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** CON NÚMERO DE CONTRATO **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01** CELEBRADO CON FECHA DE 7 DE JULIO DEL 2018 EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA

ACTA DE SITIO

No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01

CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 3)**. ----------

RESPECTO A LA OBRA ***10010059144.- MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** CON NÚMERO DE CONTRATO ***CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12*** CELEBRADO CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 4)**. ----------

RESPECTO A LA OBRA ***10010059145.- INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA, B.C.*** CON NÚMERO DE CONTRATO **CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02** CELEBRADO CON FECHA DE 3 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 5)**. ----------

RESPECTO A LA OBRA ***10010059621.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** CON NÚMERO DE CONTRATO **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10** CELEBRADO CON FECHA DE 7 DE ENERO DEL 2019 EN LA PRESENTE INSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA **(ANEXO 6)**. ----------

CON LO ANTERIOR ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL CONSTATA QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TERMINADOS, CUMPLIÉNDOSE CON EL OBJETIVO PARA LOS QUE FUERON CONTRATADOS.----------

PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, QUE SE INTEGRA CON **4** HOJAS ÚTILES; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2019**. ----------

ACTA DE SITIO

No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01

FIRMAS

POR EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

ING. CUTBERTO ZARATE CARRETERO.
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN ENSENADA.

ING. EDUARDO SALAS ALVARADO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

ING. JORGE ABRAHAM GUARDADO RAMIREZ.
SUPERVISOR DE OBRA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ZARATE
CARRETERO
CUTBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
21/03/1971

SEXO H

DOMICILIO
C SAN LUIS GONZAGA 16
COL BELLA VISTA 22820
ENSENADA, B.C.

CLAVE DE ELECTOR ZRCRCT71032102H600

CURP ZACC710321HBCRRT00 AÑO DE REGISTRO 1991 05

ESTADO 02 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0004

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

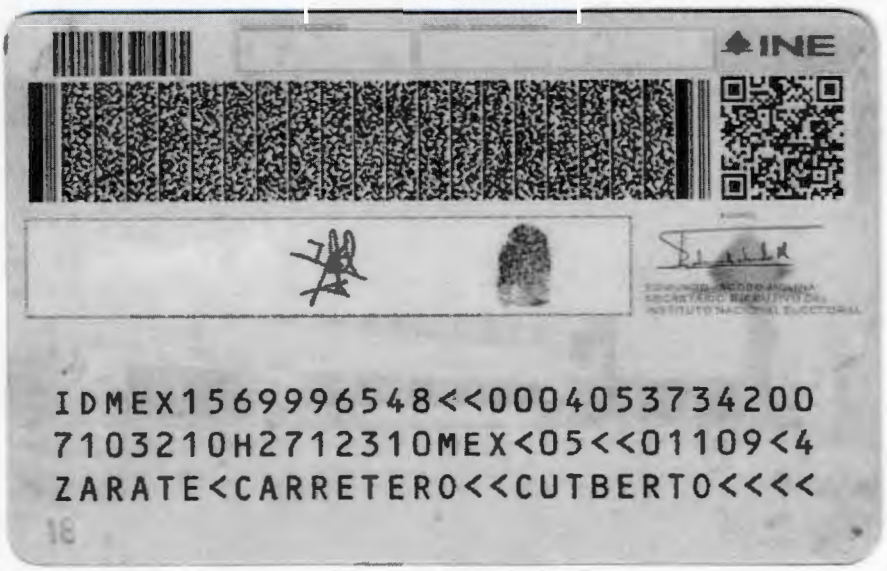

INE

IDMEX1569996548<<0004053734200
7103210H2712310MEX<05<<01109<4
ZARATE<CARRETERO<<CUTBERTO<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALAS
ALVARADO
EDUARDO

FECHA DE NACIMIENTO 18/01/1973
SEXO H

DOMICILIO
AV JUAREZ 2160 A
COL HIDALGO 22880
ENSENADA, B.C.

CLAVE DE ELECTOR SLALED730118H700
CURP SAAE730118HBCLLD05
AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 02 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0083
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

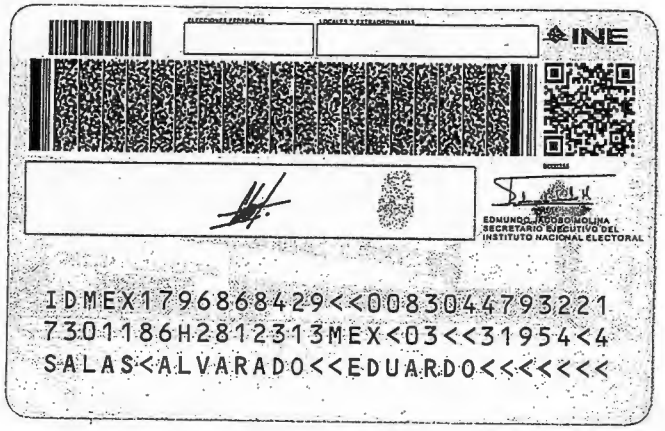

INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX179686842 9<<0083044793221
7301186H2812313MEX<03<<31954<4
SALAS<ALVARADO<<EDUARDO<<<<<<<

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MEXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
GUARDADO
RAMIREZ
JORGE ABRAHAM
DOMICILIO
CIRIO SUGHIATE 849
FRACC VALLE DORADO 22890
ENSENADA, B.C.
CLAVE DE ELECTOR GRRMJR900813302H100
CURP GURJ900813HBCRMR04
AÑO DE REGISTRO 2008 01
ESTADO 02
MUNICIPIO 001
SECCIÓN 0108
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2017
VIGENCIA 2027

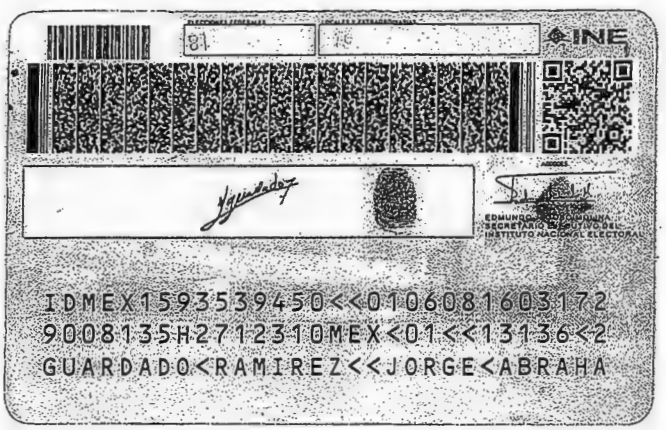
INE
IDMEX1593539450<<0106081603172
9008135H2712310MEX<01<<13136<2
GUARDADO<RAMIREZ<<JORGE<ABRAHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 1 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto de 2019

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010058527.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO, ENTRE LA CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA B.C.*** en coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE
Municipio: Ensenada, B.C.
Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)**

Obra: ***"10010058527.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO, ENTRE LA CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTIN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA B.C."***

Contrato: **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervisión Técnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 1 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto de 2019

Obra: ***"10010058527.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE XXI AYUNTAMIENTO, ENTRE LA CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTIN, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA B.C."***

Contrato: D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervisión Técnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 2 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto **de 2019**

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010058529.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE,*** en coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE

Municipio: Ensenada, B.C.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)

Obra: ***"10010058529.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE."***

Contrato: **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 2 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO
27 de agosto **de 2019**

Obra: ***"10010058529.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMALÚ Y CALLE SAN VALENTÍN EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE."***

Contrato: **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03**

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

Vista Panorámica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 3 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto de 2019

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010058531.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA PALMILLA, ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHÍA CAMALÚ, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** En coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE

Municipio: Ensenada, B.C.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)

Obra: ***"10010058531.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA PALMILLA, ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHÍA CAMALÚ, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ."***

Contrato: D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

Vista Panorámica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 3 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto de 2019

Obra: *"10010058531.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA PALMILLA, ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHÍA CAMALÚ, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ."*

Contrato: D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 4 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto **de 2019**

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010059144.- MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE*** En coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE

Municipio: Ensenada, B.C.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)**

Obra: ***"10010059144.- MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ."***

Contrato: **CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 4 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO
27 de agosto **de 2019**

Obra: ***"10010059144.- MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EN LA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ."***

Contrato: **CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 5 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto **de 2019**

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010059145.- INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA, B.C.*** En coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE

Municipio: Ensenada, B.C.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)

Obra: ***"10010059145.- INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA, B.C."***

Contrato: **CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 5 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO
27 de agosto **de 2019**

Obra: ***"10010059145.- INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA, B.C."***

Contrato: **CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02**

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

Vista Panorámica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 6 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO

27 de agosto **de 2019**

OBSERVACIÓN:

* En base al recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la *obra* ***10010059621.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE.*** En coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE), y este Órgano Estatal de Control, ambos delegación Ensenada, Baja California, con el fin de constatar que dicha obra se encuentre concluida y operando adecuadamente, así como el estado actual de la misma.
* De lo anterior y para constancia de los hechos, con relación a la situación física y operativa que guarda al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, es de indicar, que la obra se encuentra debidamente terminada, de acuerdo a las especificaciones contratadas y funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue contratado por la instancia ejecutora.

DATOS GENERALES:

Programa: FISE

Municipio: Ensenada, B.C.

Ejercicio Presupuestal: 2018

Dependencia Ejecutora: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE)

Obra: ***"10010059621.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE."***

Contrato: **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10**

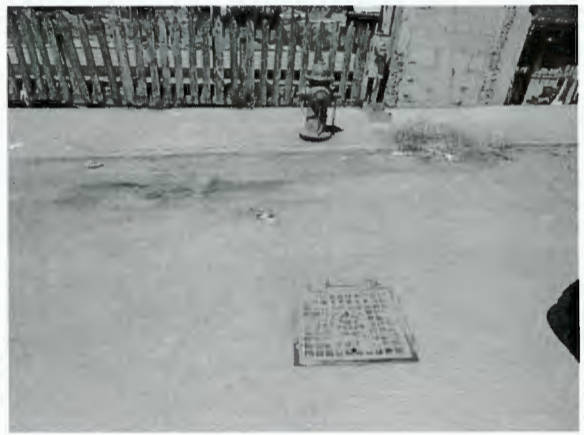

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ANEXO 6 (Acta No. BC/FISE/18-SEDESOE-ENS/01)

REPORTE FOTOGRÁFICO
27 de agosto de 2019

Obra: ***"10010059621.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS, COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE."***
Contrato: **D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10**

Vista Panorámica.

ASISTENTES:

SEDESOE: Ing. Jorge Abraham Guardado Ramirez.- Supervisor de Obra (SEDESOE)
SCTG: Ing. Cutberto Zarate Carretero.- Coordinador de Supervision Tecnica en Ensenada
Ing. Eduardo Salas Alvarado.- Supervisor de Obra.
